

JL LAW FIRM

이스트힐아파트 입주자대표회의 공동주택 하자소송 수행 제안서

건설 전문 변호사 | 건축시공기술사 | 감정료·인지대·송달료 전액 대납

18건

변호사 수행 판결

328억

판결금 합계

9,979세대

누적 수행 세대

93.28%

채권양도비율 평균

수신

이스트힐아파트 입주자대표회의 귀중

판결까지 직접 수행한 실적으로 말씀드립니다

법무법인 제이엘이 단독으로 수행해
판결에 이른 사건입니다.

이스트힐아파트 입주자대표회의 귀중

하혜용 변호사 수행 실적

18

건

외주 없이
직접 수행한 사건입니다

2018~2021년 접수 사건

328

억원

법원이 인정한
하자보수비입니다

32,836,812,673원

329

만원 · 세대당

세대 수로 나눈
실적 참고치입니다

328억 ÷ 9,979세대

1심 평균 소요

약 2년 6개월

감정 절차가 전체 기간의 핵심
변수입니다.

비용 부담

감정료·인지대·송달료 대납

착수 단계 비용을 법인이 전액
선지급합니다.

채권양도비율

평균 93.28%

판결문에서 확인된 15건 기준입니다.

실적 기준 참고치이며, 개별 사건의 회수 금액과 기간은 감정 결과·법원 판단에 따라 달라질 수 있습니다. 판결금은 법원이 인정한 하자보수비이지 회수액이 아닙니다.

— CONTENTS

목차

PART 0 · 도입

제안 개요

S1 표지 · **S2** 제안 요약 · **S3** 목차

PART 2 · 법적 구조

근거 법령과 청구 구조

S9 이원 구조 · **S10** 담보책임 존속기간

S11 채권양도 구조 · **S12** 청구 대상 3축

PART 4 · 수행 계획

소송 절차와 지원 체계

S18 소송 절차 11단계 · **S19** 동의서 징구

S20 감정 대응 · **S21** 보고 체계 · **S22** 전체 일정표

PART 6 · 법인

법무법인 제이엘

S26 법인 개요 · **S27** 담당 변호사

S28 하자소송 수행 실적 · **S29** 자격·보험

PART 1 · 단지 진단

현황과 담보책임기간

S4 단지 현황 · **S5** 담보책임기간 잔여

S6 하자 접수 집계 · **S7** 미이행 이력

S8 광고 사양 대비 실제 시공

PART 3 · 하자 발굴

JL이 찾아내는 하자

S13 하자조사 절차 90일 · **S14** 월패드

S15 타일 뒤채움 · **S16** 방수 부족시공 · **S17** 방화문

PART 5 · 비용

수임 조건

S23 보수 조건 · **S24** 비용 부담 구조 · **S25** 유의사항

PART 7 · 마무리

다음 단계

S30 예상 질의응답 · **S31** 다음 단계 및 연락처

시급성 · 전문성 · 일원화 · 이 세 가지로 제안을 구성했습니다

01

시급성

존속기간은 지나면
되돌릴 수 없습니다

- 마감공사 2년·기능상 3년 구간이 먼저 도과합니다. **도과한 항목은 감정에서 되살아나지 않습니다.**
- 사용검사 전에 발생한 미시공·변경시공 하자는 5년 구간에 남습니다.
- JL 14건 합산 기준 보수비의 66.4%가 이 5년 구간에서 나왔습니다.

02

전문성

사진에 보이지 않는 하자를
수치로 증명합니다

- 방수 두께 실측, 타일 뒤채움률, 방화문 KS 성능시험 · 외관만으로는 드러나지 않는 항목입니다.
- 준공도면·시방서 대조와 관할 지자체 정보공개청구로 설계도서 기준을 확보합니다.
- 대한변호사협회 건설 전문변호사 등록, 사무장 건축시공기술사.

03

일원화

조사부터 판결까지
한 창구로 진행합니다

- 하자조사 · 채권양도 · 소 제기 · 감정 대응 · 보고를 나누지 않습니다.
- 사건마다 담당 변호사를 지정해 문의가 한 창구로 모이게 합니다.
- 월 1회 정기 보고 + 소장 접수·감정 개시·감정서 도착·선고 시점 수시 보고.

법무법인 제이엘
단독 수행 실적

하자소송 수행 판결

18건

총 판결금

328억원

세대당 평균 판결금

329만원

실적은 판결문으로 확인된 하해용 변호사 수행 18건(9,979세대) 기준입니다. 세대당 평균은 32,836,812,673원 ÷ 9,979세대 = 3,290,592원으로 산정한 실적 기준 참고치이며, 개별 단지의 인정 금액은 감정 결과와 책임제한 비율에 따라 달라집니다.

PART 1

법무법인 제이엘

THE FIRM

누가 이 사건을 수행하는가

- 01 법인 개요
- 02 대표변호사 인사
- 03 담당 변호사
- 04 하자소송 수행 실적
- 05 자격 · 보험 · 조직

법무법인 제이엘

JL LAW FIRM

— 법인 개요 [고정]

하자소송을 조사부터 판결까지 직접 수행해 온 법인입니다

18건

변호사 수행 판결

9,979세대

누적 수행 세대

328억

판결금 합계

93.28%

채권양도비율 평균(15건)

66.4%

사용검사 전 하자 발굴 비중(14건)

단지 규모

94 ~ 1,066세대

소규모부터 대단지까지 전 구간을 수행했습니다.

사건 유형

입대의 + 관리단

입주자대표회의뿐 아니라 집합건물 관리단 사건도 수행합니다.

심급

1심 + 항소심

1심에서 끝나지 않는 사건도 항소심까지 이어서 수행합니다.

지역

전국

수도권·대구·경북·충남·전남 등 전국 단지를 수행했습니다.

법무법인 제이엘



서초 본사 · 동탄 분사무소

사무소 두 곳

서초 본사와 동탄 분사무소에서 관할을 나누어 수도권·충청 단지를 맡습니다.

—— 직접 수행 체계 [고정]

외주 없이 조사부터 회수까지 법인이 직접 말합니다

외주 없이 직접 수행

하자조사·감정 대응·소송·회수까지 법인이 직접 말합니다.

건설 전문 인력

건축시공기술사 사무장이 조사·감정 대응을 기술적으로 뒷받침합니다.

비용 선지급

감정료·인지대·송달료를 전액 대납해 착수 부담을 없앱니다.

동의서 징구 대행

입주자대표회의의 최대 실무 부담을 법인이 직접 처리합니다.

변호사와 기술사가 같은 자리에서



같은 자리에서 봅니다

변호사와 건축시공기술사가 **한자리에서** 도면과 현장을 함께 검토합니다.

주사무소(서초) 서울 서초구 서초대로53길 15 정원빌딩 4층 · 02-537-0123
www.jllawfirm.co.kr

분사무소(동탄) 경기 화성시 동탄순환대로 127-5 우성센트럴타워 914호 · 1899-4252

핵심 내용

하자소송은 서면만으로 되지 않습니다. 세대 단위 서류 처리량과 현장 대응이 결과를 좌우합니다.

수치 강조

변호사 7인 · 사무직원 36명 구성이며, 사무장은 **건축시공기술사**입니다. 도면을 읽는 인력이 법인 안에 있습니다.

기한 경고

설명회·서류 징구는 단지 일정에 맞춰야 합니다. 총회 일정이 정해지면 미리 알려 주십시오.

대표변호사 인사



박종일

대표변호사 · 공인회계사

하자소송은 **기술과 법률이 함께 걸린 사건**입니다. 도면에 있는데 시공되지 않은 것을 찾아내는 일, 즉 하자를 찾는 일은 법률 지식만으로 되지 않고, 하자를 법원에서 인정받아 손해배상금까지 받아내는 일은 기술만으로는 되지 않습니다.

법무법인 제이엘은 소송 전 하자진단부터 소 제기 이후 감정 신청 및 보완, 대응, 판결금 회수까지 **외주 없이 직접 수행**합니다. 하자소송 주무 변호사가 조사부터 판결까지 맡은 사건이 **18건, 9,979세대**입니다.

그 과정에서 확인한 것이 있습니다. 입주민들이 가장 힘들어하는 지점은 소송 자체가 아니라, 소송 전 **'무엇을 어떻게 어디서부터' 준비하느냐**의 문제였습니다. 그래서 감정료와 소송비용은 저희 법인이 **선부담**합니다. 채권양도 동의서 징구도 법인이 직접 맡습니다.

**결과를 약속드리지는 않겠습니다.
다만 맡은 일은 끝까지 직접 하겠습니다.**

법무법인 제이엘

대표변호사 박종일

검사와 공인회계사 경력을 하자소송 판단에 씁니다

경력 · 그 경력이 이 사건에서 쓰이는 곳



박종일

법무법인 제이엘 대표변호사

학력

성균관대학교 졸업

서울대학교 대학원 경영학과 수료

01 사법고시 38회 · 사법연수원 28기

공동주택 하자 사건을 집합건물법과 공동주택관리법 두 축으로 나누어 구성합니다.

02 제21회 공인회계사 · 회계법인 근무

감정서의 단가 적용과 수량 산출을 직접 검산합니다. 감정보완신청 사유의 절반이 이 두 가지입니다.

03 수원·광주·부산지방검찰청 부장검사 역임

사실관계를 증거로 세우는 순서를 기준으로 조사 단계를 설계합니다.

04 JB금융지주 사외이사

임주자대표회의 의결과 회계 처리 등 단지 내부 절차에 관한 검토를 함께 봅니다.

경력 사항은 법인 소개 자료 기재분입니다. 각 항목의 설명은 해당 경력이 하자소송 수행에서 어떻게 쓰이는지를 적은 것으로, 개별 사건의 결과를 보장하는 표현이 아닙니다.

채권양도용 세대 명단과 설명회·총회 일정을 미리 정해 주시면 맞춥니다

② 명단 · 채권양도에 필요

세대 명단	동·호수 및 소유자 성명, 등기부와 대조합니다
소유권 변동	최근 매매로 소유자가 바뀐 세대는 별도로 표시해 주시면 처리가 빨라집니다

③ 일정 · 미리 정해 주시면 맞춥니다

설명회	주민 대상 소송 설명회 일자
총회	선임 의결 및 소송 진행 의결 예정일



 핵심 내용 자료가 늦으면 조사가 늦고, 조사가 늦으면 소 제기가 늦습니다. 준비 항목을 미리 알려드립니다.	 수치 강조 정보공개청구는 접수일부터 10일 이내 결정이 원칙이므로 착수 직후 바로 넣습니다.	 기한 경고 관리사무소 자료는 보존 연한이 지나면 폐기됩니다. 오래된 접수대장과 공문부터 사본을 확보해 두시기 바랍니다.
---	--	--

— 감사합니다

단지의 하자를 기록으로 남기는 일부터 시작하겠습니다

이 제안서는 하자소송이 어떤 절차로, 무엇을 근거로 진행되는지를 설명하기 위해 작성했습니다. **회수 금액을 예측하거나 결과를 보장하지 않았습니다.** 확정할 수 없는 것을 확정해 말씀드리지 않는 것이 저희가 지키는 원칙입니다.

남은 담보책임 존속기간부터 계산해 보시고, 검토가 필요한 부분은 언제든지 말씀해 주십시오.

시급성

존속기간은 지나면
되돌릴 수 없습니다

전문성

보이지 않는 하자를
수치로 증명합니다

일원화

조사부터 판결까지
한 창구로 진행합니다

18건

판결문으로 확인된 수행 실적

9,979세대

누적 수행 세대

93.28%

채권양도비율 평균 (15건)

법무법인 제이엘

JL LAW FIRM

CONTACT

본사

02-537-0123

서울 서초구 서초대로53길 15 정원빌딩 4층

분사무소

1899-4252

경기 화성시 동탄순환대로 127-5 우성센트럴타워
914호

홈페이지

www.jllawfirm.co.kr

다음 절차

검토 의견 회신

요청하시면 단지 자료를 검토해 남은 존속기간과 조사
범위를 정리해 드립니다

본사와 동탄 분사무소 두 곳에서 관할을 나누어 맡습니다

사무소 두 곳 · 관할 법원에 맞춰 나누어 맡습니다

서울 서초 본사



서울중앙지법 인점

HEAD OFFICE

서울 서초 본사

서울 서초구 서초대로53길 15
정원빌딩 4층

02-537-0123

서울중앙지방법원·서울고등법원에 인점해 있어 변론기일과 기록 열람에 바로 대응합니다.

경기 화성 동탄 분사무소



수원지법 관할 대응

BRANCH OFFICE

경기 화성 동탄 분사무소

경기 화성시 동탄순환대로 127-5
우성센트럴타워 914호

1899-4252

수원지방법원 관할 단지를 맡습니다. 설명회·서류 징구를 위해 단지로 직접 방문합니다.

주소·연락처는 법인 등록 사항입니다. 홈페이지 www.jllawfirm.co.kr · 단지 방문 일정은 총회·설명회 일정에 맞춰 조정합니다.

인력 구성 [고정]

하자소송의 결과는 세대 단위 사무 처리량이 좌우합니다

인원 구성 · 점 하나가 한 사람입니다

7 변호사

인

36 사무직원

명



사건 수행 · 서면 작성 · 변론 · **감정 대응**을 맡습니다.



채권양도 서류 **징구·검수** · 세대 명단 관리 · 송달 관리를 맡습니다.

건축시공기술사

법인 내부 기술 인력입니다. **현장조사 입회 · 도면 대조 · 감정 항목 검토**를 변호사와 같은 자리에서 수행합니다.

핵심 내용

1,000세대 단지면 채권양도 서류가 **1,000건**입니다.
서명 확인·인적사항 대조·미회수 관리가 전부
수작업입니다.

수치 강조

변호사 수보다 **징구를 감당할 인력이 있는가**가 실제
회수율을 좌우합니다. 사무직원 36명 구성입니다.

기한 경고

설명회와 서류 징구는 단지 일정에 맞춰야 합니다. 총회
일정이 정해지면 미리 알려 주십시오.

— ASSOCIATE ATTORNEYS

세 변호사가 소송 단계별 검토를 함께 말합니다



변호사
장우진

- 사법고시 52회 · 연수원 42기
- 서울중앙지검·고등검찰청 공익법무관
- 서울중앙지방법원 민사조정위원



변호사
임준규

- 사법고시 52회 · 연수원 42기
- 형사법 전문 · 서울지방국세청 송무국
- EY한영회계법인 세무본부 Manager



변호사
오현진

- 제14회 변호사시험
- 헌법재판소 실무수습
- 사법연수원 재판실무심화연수

건설과 세무, 두 자격으로 청구 구조를 짭니다

경력 · 그 경력이 이 사건에서 쓰이는 곳



이지훈

변호사 · 건설 전문변호사 · 세무사

자격

사법고시 52회 · 사법연수원 42기

세무사

경력 사항은 법인 소개 자료 기재분입니다. 각 항목의 설명은 해당 경력이 하자소송 수행에서 어떻게 쓰이는지를 적은 것으로, 개별 사건의 결과를 보장하는 표현이 아닙니다. 변호사배상책임보험 총보상한도 20억원(청구당 1억원) 가입.

01 건설 전문변호사

하자를 도면·시방서 기준으로 특정하고, 감정 항목이 「2026 건설감정실무」 판정 기준에 맞는지 감정 단계에서 확인합니다.

02 세무사 자격

판결금 수령 후 세대별 배분과 회계 처리를 입주자대표회의 의결 절차에 맞게 검토합니다.

03 경기주택도시공사 법률고문

사업주체·시공사·보증사 사이의 계약 구조를 읽어 청구 대상과 책임 범위를 확정합니다.

04 신한은행·하나은행 법률자문

하자보수보증금 청구와 보증사 대응에 금융기관 자문 경험을 씁니다.

하자소송 18건을 조사부터 판결까지 수행했습니다

경력 · 그 경력이 이 사건에서 쓰이는 곳



하혜용

변호사 · 대한변협 건설 전문변호사

학력

충북대학교 법학전문대학원

제10회 변호사시험

01 하자소송 판결 18건 · 9,979세대

판결금 합계 **328.4억원**, 세대당 평균 **3,290,592원**(32,836,812,673원 ÷ 9,979세대). 94세대 관리단부터 1,066세대 대단지까지 수행했습니다.

02 채권양도 청구 실무

판결문에서 확인된 15건 평균 양도비율 **93.28%**. 이지더원2차 에듀그린 900세대는 **100%**, 미사강변2차푸르지오 1,066세대는 전유면적 기준 **90.74%**입니다.

03 감정 대응 · 사용검사 전 하자 발굴

감정 인정 보수비의 **66.4%**(14건 합산, 22,714,455,231 ÷ 34,199,288,617)가 미시공·변경시공 등 사용검사 전 하자입니다. 도면 대조에서 찾는 항목입니다.

04 대한변호사협회 건설 전문변호사

조사 설계부터 감정보완신청, 변론까지 **한 변호사가 처음부터 끝까지** 맡습니다.

실적은 판결문으로 확인된 하혜용 변호사 수행 18건 기준이며, 세대당 평균은 실적 기준 참고치입니다. 개별 단지의 인정 금액은 감정 결과와 책임제한 비율에 따라 달라지며, 결과를 보장하는 표현이 아닙니다.

도면을 읽는 사람이 법인 안에 있습니다

자격 보유 현황

사무장

박성제 · 건축시공기술사

국가기술자격 **건축시공기술사** · 한국기술사회 정회원

기술 인력

최경석 · 건축 특급기술자

건축기사 · 「건설기술 진흥법」상 건설기술경력 **건축 특급**

도면 검토



법인 안에서 도면을 읽습니다

건축시공기술사가 준공도면과 시방서를 직접 검토합니다. 외주 진단업체에 맡기지 않습니다.



현장에서 대조합니다

도면에 적힌 배관 간격과 경로를 현장에서 그대로 확인합니다. 실제 조사 사례입니다.

사무장은 변호사가 놓치기 쉬운 도면 대조·현장 입회를 말합니다

무엇을 하는가 · 변호사가 못 하는 일입니다

단계	기술 인력이 하는 일
조사 · 감정 신청	준공도면 · 시방서 · 내역서를 실제로 읽고 현장과 대조해 미시공 · 변경시공 항목 을 특정한 뒤, 감정 항목을 공종 단위로 구체화합니다
현장조사 입회	감정인 조사에 입회해 계측 방법과 기준 적용 을 그 자리에서 확인합니다
감정서 검토	항목 누락 · 계측 오류 · 단가 적용 · 수량 산출을 검증해 감정보완신청 사유 를 정리합니다



■ 핵심 내용 하자소송에서 다투는 것은 대부분 기술적 사실 입니다. 두께가 몇 mm인지, 뒤채움이 얼마나 부족한지, 어떤 공법이 맞는지는 법률 지식만으로 판단할 수 없습니다.	■ 수치 강조 2026 개정판이 감정인 재량을 넓혔기 때문에 기술 인력의 역할이 더 커졌습니다. 어떤 기준이 적용되는지가 현장조사 자리에서 정해집니다.	■ 기한 경고 조사 단계에서 빠진 항목은 감정에서 되살리기 어렵습니다. 착수 시점에 기술 인력이 함께 들어가야 하는 이유입니다.
--	---	--

국가기술자격증·건설기술경력증 **사본은 요청 시 제출**합니다. 개인정보가 포함되어 있어 제안서에는 자격 사실만 기재했습니다.

하자 점검과 건축자문은 (주)좋은도시관리와 함께 수행합니다

업체 개요

구분	내용
상호 · 대표	주식회사 좋은도시관리 · 대표이사 조성찬 · 2020년 7월 설립
소재지	서울특별시 서초구 남부순환로 2457, 205호 (서초동, 보성빌딩)
기술 인력	건축 특급기술자 2인 보유 · 건축(설계·시공) · 품질관리 특급

사업 영역

건설사업관리 · 하자진단 하자 점검과 건축자문을 담당하는 본 제안의 협력 영역 입니다.	정비사업전문관리 재건축·재개발 정비사업 전문관리업.	부동산개발 · 공공지원 민간임대 개발 및 임대주택 사업.
■ 핵심 내용 건축기술사·특급기술자가 하자 점검과 건축자문을 수행합니다. 법인 내부 기술 인력과 협력업체가 같은 자리에서 함께 봅니다.	■ 수치 강조 건축 특급기술자 2인 이 배치되며, 건축(설계·시공)과 품질관리 두 분야 모두 특급입니다.	■ 기한 경고 현장조사는 단지 일정과 감정 기일에 맞춰야 합니다. 착수가 정해지면 조사 인력 일정을 먼저 잡습니다.

법인등기부·사업자등록증 **사본은 요청 시 제출**합니다.

TRACK RECORD

하혜용 변호사가 판결까지 수행한 18건

9,979

누적 세대

328억

판결금 합계

329만원

세대당 평균

사건번호	단지	세대	판결금(원)	세대당(원)
2020가합5*****	미사강변2차푸르지오	1,066	3,453,345,785	3,239,536
2020가합1*****	이지더원2차 에듀그린	900	4,592,574,765	5,102,861
2020가합5*****	가락마을16단지	463	1,344,902,393	2,904,757
2020가합1*****	경북도청우방아이유엘1차	442	1,999,334,282	4,523,381
2019가합1*****	가재마을3단지	559	1,545,971,961	2,765,603
2020가합5*****	힐스테이트온파	449	1,252,700,693	2,789,979
2020가합5*****	양덕코오롱하늘채	535	1,425,762,466	2,665,000
2020가합3*****	우성KTX타워 관리단	94	316,008,868	3,361,796
2019가합2*****	대구혁신도시서한이다움2차	429	930,800,781	2,169,699
2020가합1*****	수원성균관대역 동문굿모닝힐	699	1,286,000,000	1,839,771
2021나1**** 항소심	가재마을10단지	436	1,250,767,772	2,868,733
2020가합5*****	대진유토피아	284	1,109,825,889	3,907,838
2018가합5*****	아산더샵레이크시티2차	796	2,576,151,449	3,236,371
2018가합3*****	신촌푸르지오	940	1,135,061,108	1,207,512
2020가합3*****	신안실크밸리스카이시티	790	3,129,096,298	3,960,881
2020가합5*****	예산행정타운 신동아파밀리에	462	2,131,590,488	4,613,832
2020가합6*****	한국아델리움중해마루힐	226	2,028,172,698	8,974,215
2021가합5*****	태안동문이테크코아루	409	1,328,744,977	3,248,766
합계 18건		9,979	32,836,812,673	3,290,592

사건번호는 대한변호사협회 광고 규정 확인 전까지 마스킹해 표기합니다 [확인 대기]. 판결금은 법원이 인정한 하자보수비이며, 책임제한(확인된 7건 기준 70~85%) 적용 전 금액입니다. 개별 사건의 결과를 보장하지 않습니다.

— 자격·보험 [고정]

건설 전문성과 배상 안전장치를 함께 갖췄습니다



건설 전문분야 등록
건설 분야 전문 소송 수행 등록을 마친 법인입니다.

- 공동주택 하자소송 수행 18건
- 집합건물 관리단 사건 수행

사건 수행 조직
합동소송 모두 수행



배상책임보험
수임 사건 수행 과정의 배상책임에 대비한 보험에 가입되어 있습니다.

- 의뢰인 손해에 대한 담보
- 사건 전 기간 유지



건축시공기술사 사무장
건축시공기술사 자격을 갖춘 사무장이 조사·감정 대응을 기술적으로 뒷받침합니다.

- 설계도서 대조 실무
- 감정인 현장조사 입회

역할	담당 업무
주심 변호사	사건 전략 수립, 서면 작성, 변론기일 출석, 입주자대표회의 보고
협력 변호사	쟁점별 검토, 감정 결과 분석, 청구취지변경신청서 작성
건축시공기술사	하자조사, 설계도서 대조, 감정인 현장조사 입회, 감정 결과 검증
사무직원	채권양도 동의서 접수·정리, 자료 관리, 진행 상황 안내

등록증·보험증서 사본은 요청 시 제출합니다.

PART 2

하자소송의 구조

LEGAL STRUCTURE

무엇을 근거로 청구하는가

- 01 하자소송이란
- 02 집합건물법과 공동주택관리법
- 03 담보책임 존속기간
- 04 채권양도 구조
- 05 청구 대상 3축

법무법인 제이엘

JL LAW FIRM

— WHAT IS A DEFECT LAWSUIT

하자소송은 "고쳐 달라"가 아니라 "고칠 돈을 달라"는 소송입니다

공동주택에 하자가 있으면 시공사에 보수를 요구할 수 있습니다. 그런데 보수가 이행되지 않거나 부실하게 끝나는 경우가 많습니다. 이때 구분소유자는 보수에 들어가는 손해배상, 즉 하자를 고치는 데 드는 비용을 돈으로 청구할 수 있습니다. 이것이 하자소송입니다.

하자 발생

미시공·변경시공·부실시공 및 사용 중 발생 하자

보수 요구·미이행

관리사무소가 시공사에 요청했으나 이행되지 않습니다

하자조사·채권양도

도면 대조로 하자를 특정하고
구분소유자 채권을 양도받습니다

소송·감정

법원 감정으로 보수비를 산정

판결·회수

인정된 금액을 회수해 보수공사에
사용

왜 입주자대표회의가 원고인가

손해배상청구권은 각 구분소유자에게 있습니다. 세대별 개별 소송은 현실적으로 불가능하므로, 채권을 양도받아 입주자대표회의 명의로 한 건의 소송을 수행합니다.

왜 기한이 중요한가

담보책임 존속기간은 공종별로 2·3·5·10년입니다. 기간이 지나면 그 공종은 청구할 수 없습니다. 그래서 사용검사일 확인이 첫 단계입니다.

왜 감정이 핵심인가

청구액은 법원 감정으로 확정됩니다. 조사에서 빠진 항목은 감정에서 다투기 어렵습니다. 소송의 승부는 감정 전에 갈립니다.

한 줄로 기한 안에 · 하자를 빠짐없이 찾아내고 · 세대 동의를 최대한 모아 · 법원 감정에서 지켜내는 것. 이 네 가지가 회수 금액을 결정합니다.

— LEGAL BASIS · TWO STATUTES

집합건물법과 공동주택관리법이 함께 적용됩니다

구분	집합건물법의 소유 및 관리에 관한 법률	공동주택관리법
성격	사법 성격 · 담보책임 · 손해배상의 근거	행정 규율 · 하자보수 절차 · 보증금 · 분쟁조정
핵심 조문	제9조(담보책임) · 제9조의2(존속기간)	제36조 · 제37조 · 제38조 · 제39조

두 법이 만드는 실제 청구 흐름



이 제안서에서 실제로 청구를 만드는 것은

집합건물법 제9조 계열의 손해배상청구권

공동주택관리법은 보수 청구와 보증금 청구·조정 절차의 통로이며, 두 경로는 병행하여 활용할 수 있습니다.

근거

민법 제667조·제668조 준용 (집합건물법 제9조 제1항)

→ 존속기간 내 하자에 한해 성립 (S10 참조)

하자는 네 가지 유형으로 나뉘고, 어느 유형으로 보느냐에 따라 기간이 달라집니다

유형 구분 · 「2026 건설감정실무」 정리

01

미시공

설계도서에 있는데 **아예 시공되지 않은 것**.

세대 통신단자함 예비전원장치가 대표적입니다.

02

변경시공

설계도서와 **다른 자재·규격**으로 시공한 것.

단열재 THK85 설계를 THK60으로 넣은 경우입니다.

03

부실시공

시공은 했으나 **시방 기준에 못 미치는 것**.

방수층 두께 부족, 타일 뒤채움 부족이 여기 해당합니다.

04

설계상 하자

시공이 아니라 **설계 자체**가 기준에 미달하거나 부적합한 것.

설계도서 대조로만 드러납니다.



마감 뒤에 가려진 것

미시공·변경시공은 **도면과 대조해야** 드러납니다. 눈에 보이는 하자가 전부가 아닙니다.

유형을 잘못 잡으면 담보책임기간이 통째로 바뀝니다

유형을 정확히 잡아야 하는 이유

기간이 길립니다 마감공사로 보면 2년, 미시공·변경시공으로 보면 5년 구간에 남습니다

**산정 방식이
길립니다** 철거·재시공비로 볼지 시공비 차액으로 볼지가 유형에 따라 달라집니다

**입증 방법이
길립니다** 미시공은 도면 대조로, 부설시공은 실측·시험으로 증명합니다



■ 핵심 내용

종전에 쓰이던 「오시공」이라는 표현은 「2026 건설감정실무」에서 정리되어, 미시공·변경시공·부설시공·설계상 하자로 구분합니다.

■ 수치 강조

미시공이나 변경시공 자체가 하자인 경우는 사용검사 전 하자과 마찬가지로 보아 담보책임기간의 제한을 받지 않습니다 (대법원 2012. 7. 12. 선고 2010다108234 판결).

■ 기한 경고

유형 분류는 조사 단계에서 끝내야 합니다. 소 제기 후에 바꾸면 청구 원인을 다시 짜야 합니다.

— 판단 기준의 변화 [고정]

하자 판단의 기준이 되는 「건설감정실무」가 10년 만에 개정됐습니다

개정 연혁

1 2011. 9. 서울중앙지방법원 건설소송실무연구회 최초 발간	2 2014. 2. 법원행정처 건설감정 매뉴얼	3 2015년 건설감정실무 추록(개정)	4 2016. 10. 2016 개정판 · 이후 10년간 표준으로 기능	5 2026. 1. 2026 개정판 발간
--	---	---	---	---

2026 건설감정실무

발간
서울중앙지방법원 건설소송실무연구회

개정
2016년판 이후 10년 만

의미
하자 판단의 사실상 표준

새 문서를 나란히 놓고 대조할 때 비로소 하자 여부를 알릴 수 있습니다

「2026 건설감정실무」

서울중앙지방법원 건설소송실무연구회가 발간한 **하자 판단의 사실상 표준**입니다. 2016년판 이후 10년 만의 개정입니다.

개정으로 달라진 것

균열
충전식 보수를 원칙으로

타일
부착강도 0.39N/㎠ 기준

발수
통일 기준을 제시한지 없음

새 문서를 나란히 놓고 대조할 때 비로소 하자 여부를 알릴 수 있습니다

개정으로 달라진 것

균열은 **충전식 보수**를 원칙으로, 타일은 **부착강도 0.39N/㎠** 기준이 새로 생겼습니다.

판단 기준이 감정인마다 달라 개정이 필요했습니다

왜 바뀌었나

변화된 시공 환경

2016 개정판의 일부 내용이 달라진 건설 환경과 실무를 반영하지 못한다는 지적이 있었습니다.

고도화된 분쟁 양상

하자소송에서 새로 다투어지는 항목들에 유효·적절한 판단 기준이 없었습니다.

개정 법령 미반영

표준시방서·국토교통부 고시 등의 개정 사항이 제대로 반영되지 못했습니다.



■ 핵심 내용

전면 개편이 아니라 **기존 원칙을 유지하면서 기준을 구체화**하고, 감정인이 현장 여건을 고려해 판단할 수 있도록 **재량을 넓힌** 개정입니다.

■ 수치 강조

재량이 넓어졌다는 것은 **감정 과정에서의 대응이 곧 결과**가 된다는 뜻입니다. 감정 신청 단계부터 개정된 기준에 맞춘 전략이 필요합니다.

■ 기한 경고

현재 진행 중이거나 앞으로 제기될 사건에는 **2026 개정판이 적용**됩니다. 2016년 기준으로 준비된 조사·감정 항목은 그대로 쓸 수 없습니다.


출처: 「2026 건설감정실무」(서울중앙지방법원 건설소송실무연구회, 사법발전재단, 2026. 1.) 개정 내용에 관한 법무법인 발간 해설 자료 **[2차 출처]**. 개별 수치는 원문 확보 후 근거 등급을 올립니다. 판결례는 원문 확인 전이므로 판시 취지를 단정하지 않았습니다.

— 하자 판단의 기준 [고정]

무엇을 보고 하자라고 하는가 · 설계도서의 우선순위가 정리됐습니다

2026 개정판이 정리한 우선순위

기준	내용
공사시방서 우선	건축공사 표준시방서보다 해당 현장의 공사시방서를 우선하여 해석합니다 (기본 원칙, 2016 개정판과 동일)
다만 안전은 역전	중대한 기능·성능·안전상 시공기준은 공사시방서의 기준이 표준시방서보다 낮은 경우 표준시방서를 우선 적용할 수 있습니다
자재 제조사 시방서	공사시방서에 "자재 제조사의 기준에 따른다"는 취지의 기재가 있으면 원칙적으로 하자 판단의 기준이 될 수 있습니다
준공내역서	준공도면과 준공내역서의 기재 내용에 따라 적용 우선순위를 경우의 수로 나누어 제시했습니다
그 밖의 기준	개별 하자 항목에 따라 관련 법률·표준품셈·한국토지주택공사 시방서 등도 판단 기준이 될 수 있습니다

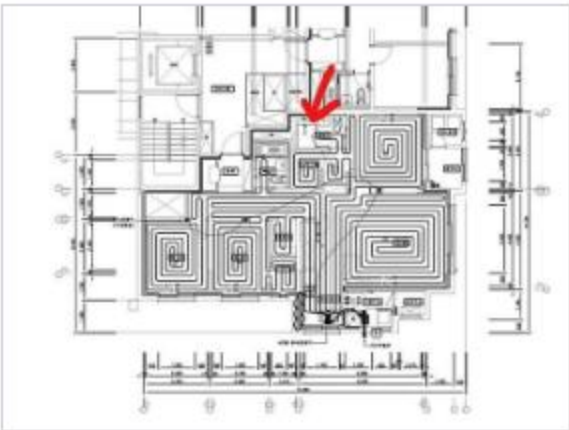

설계도서의 우선순위

공사시방서가 표준시방서보다 우선합니다. 문서 간 불일치는 감정에서 그대로 다툼이 됩니다.


— 조사의 출발점 [고정]

설계도서를 먼저 확보해야 실제 시공과 대조할 수 있습니다

그래서 설계도서 확보가 첫 단계입니다

무엇이 달라지나 같은 하자라도 어느 문서를 기준으로 보느냐에 따라 하자 여부와 보수 범위가 달라집니다

우리가 하는 일 사업승인·준공 시점의 도면·시방서·내역서를 정보공개청구로 확보한 뒤 조사에 들어갑니다

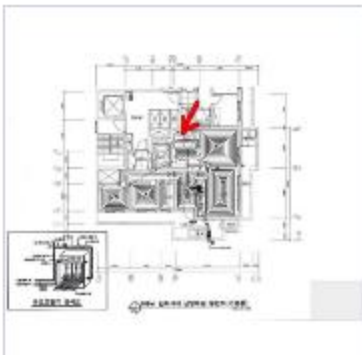

설계도면

단위세대 난방배관 평면도입니다. 배관 간격과 경로가 도면에 수치로 적혀 있습니다.

이 문서를 확보해야 현장에서 무엇을 재야 하는지가 정해집니다.



실제 시공

같은 공종의 현장 상태입니다. 타 단지 조사 사례로, 단지명·동호수는 드러나지 않습니다.

도면과 나란히 놓고 대조할 때 비로소 하자 여부를 말할 수 있습니다.

핵심 내용

기준 문서를 확보하지 못한 상태에서 현장을 보면 무엇이 하자인지 판단할 수 없습니다. 조사보다 **설계도서 확보가 먼저인 이유**입니다.

수치 강조

설계도서 기재가 모호하거나 문서 간 불일치가 있으면 감정 단계에서 그대로 다툼이 됩니다. **미리 확인해 두는 것이 감정 대응의 출발점**입니다.


기한 경고

정보공개청구는 접수일부터 10일 이내 결정이 원칙이나 비공개 결정 시 이의신청·행정심판을 거쳐야 합니다. **착수 직후 바로 청구합니다.**

출처: 「2026 건설감정실무」(서울중앙지방법원 건설소송실무연구회, 사법발전재단, 2026. 1.) 개정 내용에 관한 법무법인 발간 해설 자료 **[2차 출처]**. 개별 수치는 원문 확보 후 근거 등급을 올립니다. 판결례는 원문 확인 전이므로 판시 취지를 단정하지 않았습니다.

— 담보책임 존속기간 [고정]

담보책임 존속기간은 공종에 따라 2년에서 10년까지 구분됩니다

기간	구분	존속기간 길이 비교	세부 공종
10년	주요구조부·지반공사		10년 내력벽·기둥·바닥·보·지붕틀·주계단, 지반공사
5년	기산일 전 발생 하자		5년 미시공·변경시공 등 사용검사 전 하자
5년	구조상·안전상 하자		5년 대지조성·철근콘크리트·철골·조적·지붕 및 방수공사 등
3년	기능상·미관상 하자		3년 건축설비공사·목공사·창호공사·조경공사 등
2년	마감공사 하자		2년 발견·교체·보수가 용이한 하자

기산점·전유부분
구분소유자에게 인도한 날

기산점·공용부분
사용검사일(주택법) / 사용승인일(건축법)

사용검사 전 하자 = 5년 구간
JL 14건 실적상 보수비의 66.4%

근거: 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제9조의2 + 같은 법 시행령 제5조. 적용 법령 분기는 2013.6.19. 이후 분양 · 2016.8.12. 이후 사용검사입니다. 66.4%는 하해용 변호사 수행 사건 중 판결문에 하자보수비 총괄집계표가 있는 14건의 합산 기준($22,714,455,231 \div 34,199,288,617$)이며, 사건별 범위는 34.7~93.9%입니다. **2년차·3년차가 도과해도 미시공·변경시공 하자는 5년 구간에 남습니다.**

— 채권양도 구조 [고정]

동의(채권양도) 세대 비율이 곧 청구 규모입니다

채권양도 구조

ASSIGNMENT OF CLAIM STRUCTURE



양도 전유면적 / 전체 전유면적 = 청구 규모

공용부분 손해배상채권은 전유부분 면적 비율로 귀속되므로, 양도비율도 세대 수가 아니라 전유면적으로 산정합니다

양도비율



93.28%

청구권자

하자 손해배상청구권은 원칙적으로 각 구분소유자에게 귀속됩니다.

산정 기준

공용부분 채권은 전유부분 **면적 비율**로 귀속됩니다.
양도비율도 세대 수가 아니라 전유면적으로 계산합니다.

양도비율이 곧 청구 규모

공용부분 손해배상채권은 **전유부분 면적 비율**로 각 구분소유자에게 귀속됩니다. 양도받지 못한 면적만큼 청구할 수 없습니다.

93.28%

하혜용 변호사 수행 사건 평균 · 판결문에서 양도비율이 확인된 15건 기준(범위 75.01~100%)

4차

양도 통지는 여러 차수로 나눠 진행합니다. 낮은 차수는 2·3년차 하자가 제척기간으로 소멸한 사례가 있습니다

결론

양도받지 못한 면적 비율만큼 청구 규모가 줄어듭니다.
징구 지원이 핵심입니다.

— 청구 대상 3축 [고정]

청구 상대방은 분양자·시공사·보증기관 셋으로 나뉩니다



분양자

시행사·조합. 집합건물법 제9조에 따른 담보책임의 1차 주체입니다.

근거 집합건물법 제9조 제1항

확인 분양계약서·건축물대장·등기사항증명서·신탁원부

주의 신탁사가 분양자인 경우가 있고, 무자력인 사례가 많습니다



시공사

개정 집합건물법에서 법정책임화되어, 분양자에게 회생·파산·무자력 등 사유가 있는 경우 직접 청구할 수 있습니다.

근거 집합건물법 제9조 제3항

확인 건축물대장·도급계약 관계

주의 분양자에게 이미 배상한 범위에서는 책임을 면합니다



보증기관

건설공제조합·서울보증보험·주택도시보증공사 등. 하자보수보증금을 청구합니다.

근거 공동주택관리법 제38조·보증계약

확인 하자보수보증서(보증금액·보증기간·연차별 구분)

주의 사용검사 후 하자만 보증 대상입니다

실무상 반드시 구분해야 하는 것

보증금은 보수 용도로만

보증금은 하자보수에만 쓸 수 있어 그것만 청구하면 회수가 어렵습니다

보증금 청구는 임대인의 고유 권한

채권양도 비율의 영향을 받지 않는 별도 청구입니다

사용검사 전 하자는 보증 대상 아님

보수비의 66.4%를 차지하는 이 부분은 분양자·시공사에게 청구합니다

세 축을 함께 걸어 두는 것이 원칙입니다. 소 제기 후 다툼 없는 사실로 피고를 정리하는 것이 실무 관례입니다.

청구 경로 [고정]

하자를 이유로 할 수 있는 청구는 네 갈래이고, 성격이 서로 다릅니다

구분	근거 법령	상대방	받는 것
손해배상청구	집합건물법 제9조 (민법 제667조 이하 준용)	분양자·시공자	금전 · 이 제안서가 수행하는 청구
하자보수청구	공동주택관리법 제36·37조	사업주체	보수 이행
하자보수보증금 청구	공동주택관리법 제38조	보증기관	보증금 한도 내 금전
하자심사·분쟁조정	공동주택관리법 제39조	하자분쟁조정위원회	조정안



청구는 법원에서 다룹니다

집합건물법 제9조 계열의 **손해배상청구권**이 이 제안서가 실제로 만드는 청구입니다.

네 갈래는 배타적이지 않지만, 조정만 고집하면 기간을 놓칠 수 있습니다

네 갈래는 배타적이지 않습니다

병행할 수 있습니다

보수청구와 손해배상청구는 목적이 다르므로 함께 진행할 수 있습니다. 다만 **같은 하자에 대해 이중으로 받지는 못합니다.**

보증금은 한도가 있습니다

하자보수보증금은 보증서에 적힌 한도까지입니다. 실제 보수비가 그보다 크면 **차액은 손해배상으로 청구해야** 합니다.

조정은 강제력이 약합니다

조정안을 상대가 받아들이지 않으면 그대로 끝납니다. 기간만 흐를 수 있어 **존속기간이 임박한 단지에는** 권하지 않습니다.



| 소 제기의 의미

조정만 고집하다 **담보책임기간을 놓치면** 되돌릴 수 없습니다.

| 핵심 내용

임주자대표회의가 세대로부터 채권을 양도받아 자기 이름으로 손해배상을 청구하는 것이 가장 넓은 범위를 다룹니다.

| 수치 강조

손해배상 범위는 보증금 한도에 묶이지 않고, 감정으로 산정된 보수비 전액을 청구 대상으로 삼습니다.

| 기한 경고

조정을 먼저 시도하다 존속기간을 넘기는 사례가 있습니다. 남은 기간을 먼저 계산하고 경로를 정해야 합니다.

임주자대표회의가 당연히 할 수 있는 것과, 세대 동의가 필요한 것은 다릅니다

구분해서 보아야 합니다

구분	내용	근거·요건
권리로 인정	공용부분 하자에 관한 보수 청구	공동주택관리법 제37조 · 임대인이 청구권자
권리로 인정	하자보수보증금의 청구·수령	공동주택관리법 제38조
동의 필요	전유부분 하자의 손해배상청구	세대별 채권양도 · 구분소유자가 채권자
동의 필요	공용부분 손해배상청구	구분소유자로부터 채권을 양도받아 진행
협의로 결정	소송 제기 여부와 위임 조건	임대의 의결 + 필요 시 임주자 동의 절차



임주자대표회의

보수 청구와 보증금 청구는 **임대의 권한**이지만, 전유부분 손해배상은 **세대 동의**가 필요합니다.

전유부분 손해배상은 임대인이 아니라 세대의 채권양도로 시작됩니다

그래서 채권양도가 소송의 출발점입니다

왜 필요한가 손해배상채권은 원칙적으로 **각 구분소유자**에게 있습니다. 임대인이 자기 이름으로 청구하려면 양도받아야 합니다

무엇이 달라지나 양도율이 곧 청구 범위입니다. 하혜용 변호사 수행 18건 중 15건에서 확인된 **평균 93.28%**입니다

전유부분은 세대가 채권자입니다

전유부분은 세대가 채권자입니다	
상도명	구분소유자 세대
임대인	임대인 세대
세대 내 명	세대원 - 세대 내 명
세대 내 명	세대원 - 세대 내 명

전유부분은 세대가 채권자

임대인의 의결만으로는 전유부분 손해배상을 청구할 수 없습니다. **구분소유자의 양도**가 있어야 합니다.

핵심 내용

권리로 단정할 수 있는 것과 세대 동의가 필요한 것을 구분해 설명드립니다. 이 구분을 흐리면 나중에 당사자적격 다툼이 생깁니다.

수치 강조

하혜용 변호사 수행 사건 판결문 15건 기준
채권양도비율은 평균 93.28%, 중앙값 95.25%, 범위 75.01~100%입니다.

기한 경고

양도서 청구에는 시간이 걸립니다. 존속기간이 임박한 단지는 1차 양도분만으로 먼저 소를 제기하고 추가 양도를 뒤에 붙입니다.

하심위 하자심사에서 판정서 10건 중 약 7건이 하자로 인정됩니다

국토교통부가 공개한 처리 현황

처리량

연평균 4,600여건

'21~'25년 5년간 하자심사·분쟁조정·재정을 합해 연평균 약 4,600건을 처리했습니다. '25년은 4,761건입니다.

인정률

68.3%

판정서 교부 11,081건 중 **7,573건이 하자로 판정**됐습니다. 연도별로는 61.0~78.8% 사이에서 움직입니다.

보수 의무

60일 이내

하자로 판정되면 사업주체는 공동주택관리법령에 따라 **60일 이내 보수**하고 하자관리정보시스템에 결과를 등록해야 합니다.

명단 공개

반기마다

하자 판정 건수·비율 상위 건설사 명단이 반기마다 공개됩니다. '26년 하반기부터는 하심위 누리집에 게시됩니다.

하자심사·분쟁조정위원회



하자심사·분쟁조정위원회

판정서 **10건 중 약 7건**이 하자로 인정됩니다. 조정과 소송은 병행할 수 있습니다.

하심위 조정과 소송은 절차·기간·강제력이 다릅니다

소송과 어떻게 다른가 · 헛갈리기 쉬운 부분입니다

하심위 하자심사	하자인지 아닌지를 판정 합니다. 보수 이행을 이끌어내는 절차이며 금전 배상을 정하지 않습니다
손해배상 소송	보수에 드는 비용을 금전으로 청구합니다. 이 제안서가 수행하는 절차입니다
함께 쓰는 방법	하심위 판정 결과와 보수 미이행 기록 은 소송에서 하자의 존재와 미이행을 뒷받침하는 자료가 됩니다



조정과 소송의 차이

조정은 빠르지만 **강제력이 없고**, 소송은 시간이 걸리지만 집행력이 있습니다.

핵심 내용

하심위 통계는 **하자심사 신청분**의 통계이지 소송 통계가 아닙니다. 다만 공동주택 하자가 어떤 규모로 다투어지는지 보여주는 공식 자료입니다.

수치 강조

판정 후 **60일 이내 보수·등록 의무**가 있습니다. 이 기한을 넘긴 기록이 남아 있다면 소송에서 미이행을 증명하는 근거가 됩니다.

기한 경고

하심위 절차는 판정까지 시간이 걸립니다. **담보책임 존속기간이 임박한 단지는 조정만 기다리면 안 됩니다.**

출처: 국토교통부 보도자료 「'26년 상반기 공동주택 하자 판정 상위 20개 건설사 명단 공개」(2026. 3. 29.) 및 같은 자료 참고1·참고2 **[1차 출처 · 공공저작물]**

PART 3

단지 진단

SITE DIAGNOSIS

이 단지는 지금 어떤 상태인가

- 01 단지 현황
- 02 담보책임기간 잔여
- 03 하자 접수 집계
- 04 미이행 하자보수 이력
- 05 광고 사양 대비 실제 시공

법무법인 제이엘

JL LAW FIRM

— 단지 현황 [가변]

예시 슬롯

이스트힐아파트의 기본 현황입니다

단지명	이스트힐아파트	사용검사일	2016-11-01
소재지	경기도 구리시 갈매중앙로 132	시행사	한국토지주택공사(LH)
총 세대수 / 동수	1,444세대 / 14개동	시공사	임광토건(주)
복도유형 · 난방	계단식 · 지역난방	관리방식	위탁관리

이 정보가 결정하는 것

사용검사일 → 담보책임기간
공종별 만료일이 이 날짜 하나로 계산됩니다 (S5)

시행사·시공사 → 피고
청구 상대방과 신탁·무자력 여부를 확인합니다 (S12)

총 세대수 → 청구 규모
전유면적 기준 채권양도 대상이 됩니다 (S11)

사용검사필증 담보책임 기산일 확정 근거	하자보수보증서 보증기관·보증금액·보증기간	입주자모집공고문 광고 사양 대비 시공 대조 (S8)	하자 접수대장 유형별·동별 집계 (S6)
---------------------------------	----------------------------------	--	----------------------------------

단지 정보 입력표(template/data/<단지>.json) 한 건으로 이 장과 S5 타임라인이 함께 채워집니다.

— 단지 현장 [가변]

이스트힐아파트 현장에서 저희가 먼저 보는 곳은 세 군데입니다


외벽에서 먼저 드러납니다



균열·백화·타일 탈락

외벽·외부 마감

균열·백화·타일 탈락이 먼저 드러나는 곳입니다. 지상에서도 상당 부분 확인됩니다.

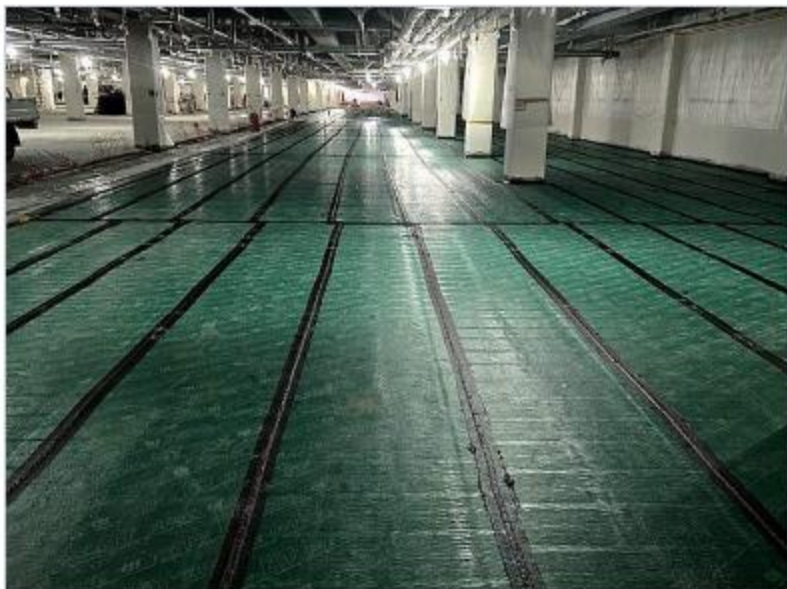

지하주차장

천장·바닥·벽면에 누수 자국과 방수 상태가 나타납니다. 면적이 커서 금액도 큼니다.

옥상 방수층과 배수구




돌뜸·갈라짐·고인 물

옥상·옥탑

방수층 표면과 배수구 주변의 돌뜸·갈라짐·고인 물이 그대로 조사 항목이 됩니다.

실물 사진은 타 단지 조사 사례이며 단지명·동호수·업체명이 드러나지 않도록 확인한 것만 실었습니다. 도해는 절차와 판단 기준을 나타낸 것으로 특정 단지의 상태를 나타내지 않습니다.

이스트힐아파트의 담보책임기간, 공종별로 여유와 도과가 갑니다

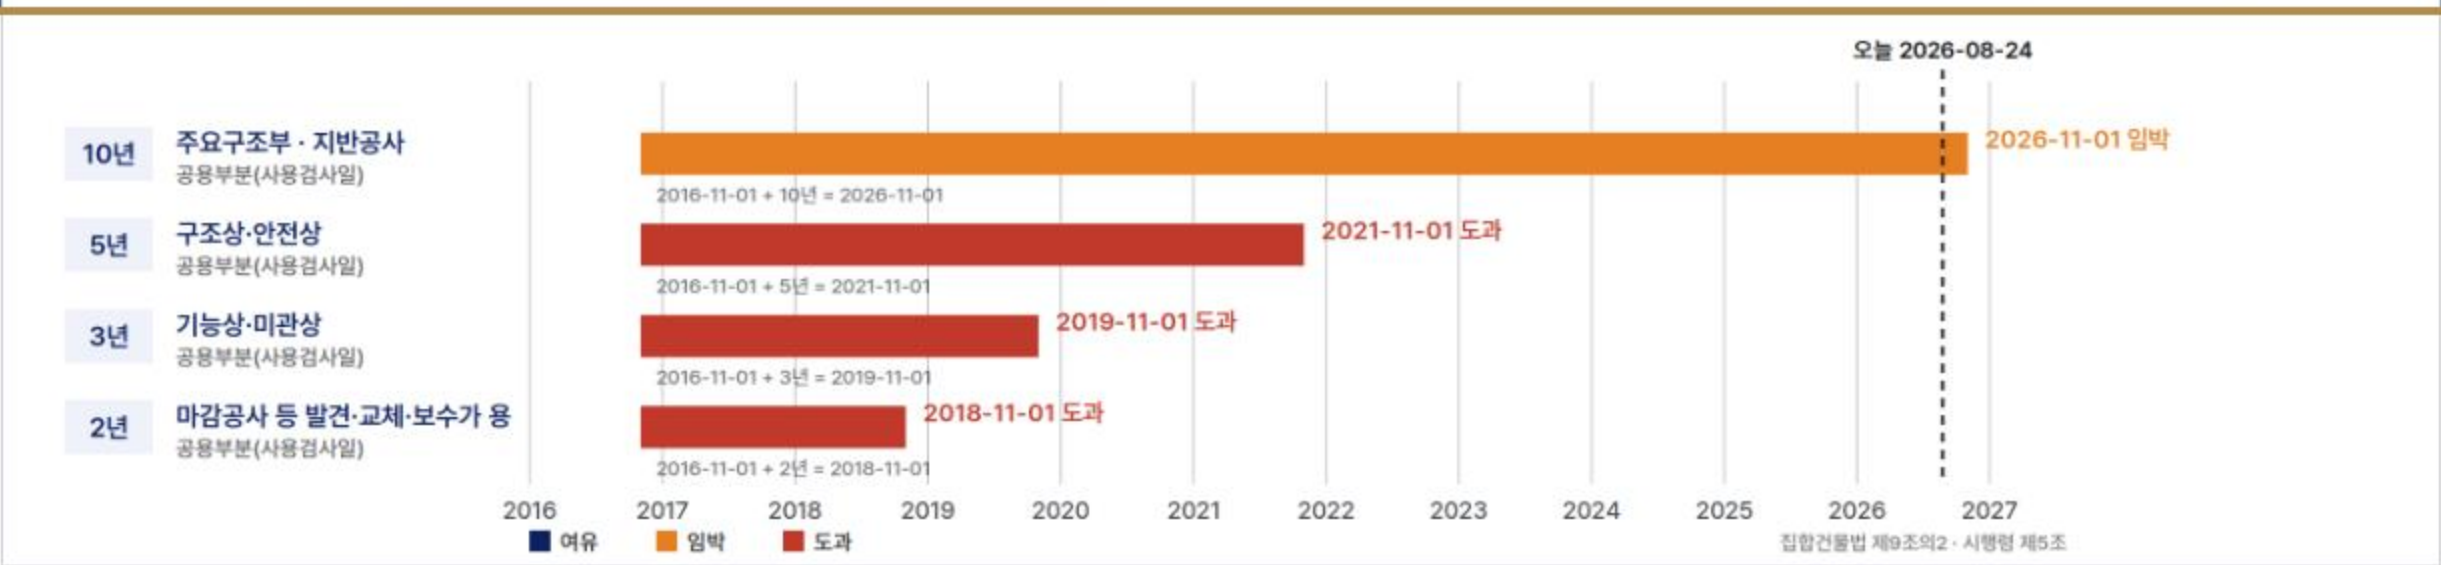


● 주요구조부·지반공사 (10년)	2016-11-01 + 10년 = 2026-11-01	임박
● 구조상·안전상·철근콘크리트·조적·지붕·방수 (5년)	2016-11-01 + 5년 = 2021-11-01	도과
● 기능상·미관상·건축설비·목공사·창호·조경 (3년)	2016-11-01 + 3년 = 2019-11-01	도과
● 마감공사 등 발견·교체·보수 용이 하자 (2년)	2016-11-01 + 2년 = 2018-11-01	도과


기산일은 사용검사일(공용부분) 기준입니다. 이미 도과한 공종은 숨기지 않고 그대로 표시하며, 남은 구간에 청구를 집중하는 근거로 씁니다. `python3 tools/timeline.py template/data/<단지>.json`으로 재계산됩니다.

이스트힐아파트 하자 접수는 유형별·동별로 이렇게 집계됩니다

유형별 접수 건수

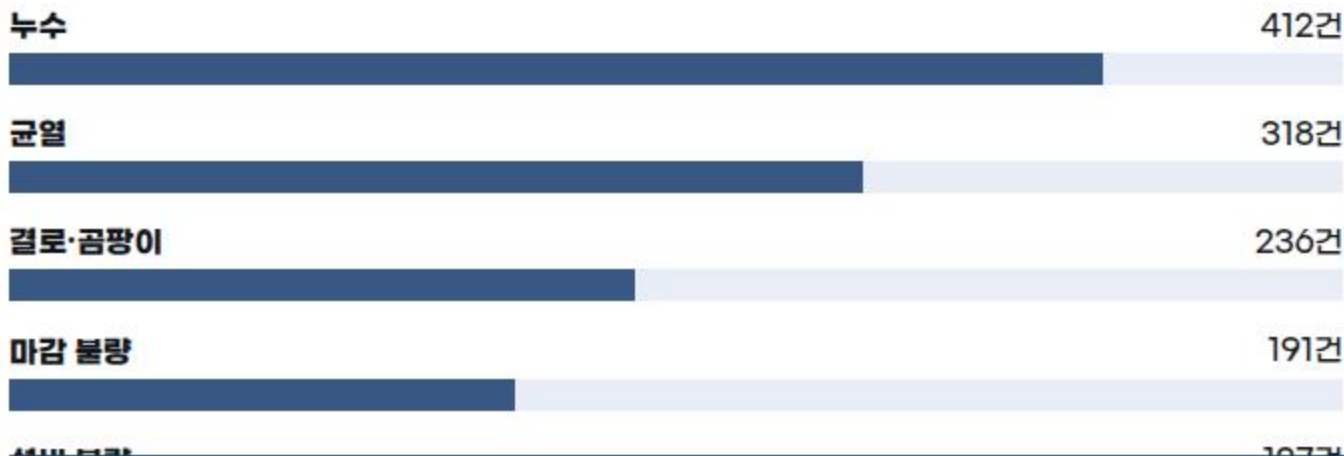

동별 접수 밀도

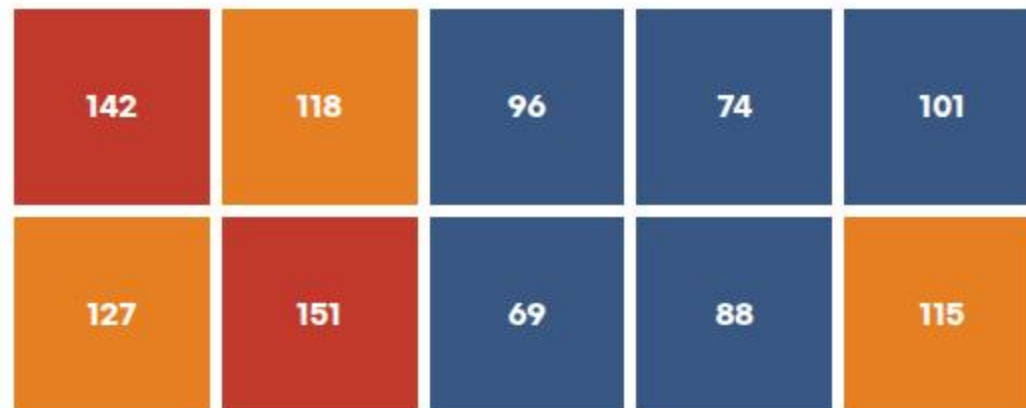

이 슬라이드는 관리사무소가 보유한 세대 하자 접수대장이 있을 때만 채워집니다. 위 막대 길이와 색상은 레이아웃 예시이며 실제 값이 아닙니다. 자료가 없으면 이 슬라이드는 삭제하고 진행합니다.

핵심 내용

접수 기록은 그 자체로 증거입니다. 같은 부위에 반복 접수된 이력은 일시적 현상이 아니라 시공에서 비롯된 하자라는 근거가 됩니다.

수치 강조

건수보다 **반복 접수**와 **최초 접수일**이 중요합니다. 최초 접수일이 사용검사 이후 발생 하자의 발생 시점을 특정합니다.

기한 경고

관리사무소 자료는 보존 연한이 지나면 폐기됩니다. 오래된 접수대장과 공문부터 사본을 확보해야 합니다.

관리사무소에 쌓인 하자 접수 기록이 그대로 청구 근거가 됩니다

세 가지로 쓰입니다

01

하자의 존재

같은 부위에 반복 접수된 기록은 **일시적 현상이 아니라는** 근거가 됩니다.

02

발생 시점

접수 일자가 곧 발생 시점의 증거입니다. **결로처럼 사용검사 후에 나타나는 하자**에서 결정적입니다.

03

미이행 사실

보수 요구 공문과 회신을 대조하면 **무엇이 이행되지 않았는지**가 드러납니다.

접수 기록이 곧 증거입니다



세 문서를 나란히 놓고 대조할 때 비로소 하자 여부를 알릴 수 있습니다

공문과 회신은 함께 봅니다



세 문서를 나란히 놓고 대조할 때 비로소 하자 여부를 알릴 수 있습니다

접수 기록이 곧 증거입니다

건수보다 **반복 접수와 최초 접수일**이 중요합니다. 최초 접수일이 하자 발생 시점을 특정합니다.

공문과 회신은 함께 봅니다

요구했는데 **이행되지 않은 이력**이 남아 있으면 그 자체가 청구의 근거가 됩니다.

관리사무소 자료는 접수·처리·미이행 세 갈래로 정리합니다

제출해 주시면 이렇게 정리합니다

1 원자료 수령 하자 접수대장 · 공문 · 회신 · 보수 지출 내역	2 부위·유형 분류 14종 하자 유형 체계로 재분류	3 중복·시점 정리 반복 접수를 묶고 최초 접수일을 특정	4 감정 항목 연결 감정신청서 항목으로 옮겨 근거로 붙입니다
--	---	--	--



핵심 내용 단지가 이미 가지고 있는 자료가 가장 값싸고 강한 증거입니다. 새로 만들 필요 없이 정리만 하면 됩니다.	수치 강조 접수 건수 자체보다 같은 부위의 반복 접수가 중요합니다. 반복은 시공 원인을 가리키고, 일회성은 사용 원인으로 반박당합니다.	기한 경고 관리사무소 자료는 보존 연한이 지나면 폐기됩니다. 착수 시점에 먼저 사본을 확보해 두어야 합니다.
--	---	--

이스트힐아파트은 하자보수를 요청했지만 이행되지 않았습니다



일자	구분	내용
2018-05-14	공문 발송	1차 하자보수 요청 (공용부 누수·균열 62개소)
2018-07-02	시공사 회신	일부 보수 착수 회신, 완료 예정일 미제시
2019-03-21	재요청	2차 하자보수 요청 (미보수 41개소 재통보)
2026-08-24	현재	공용부·전유부 하자 다수 잔존, 보수 미이행

이 슬라이드는 관리사무소가 시공사에 보낸 **하자보수 요청 공문·회신**이 있을 때만 채워집니다. 자료가 없으면 삭제하고 진행합니다.

이스트힐아파트 분양 당시 고지된 사양과 실제 시공을 대조합니다

입주자모집공고문 · 분양 카탈로그 원문

"전 세대 거실 및 침실 바닥재 강화마루 시공"

출처: 입주자모집공고문 12면 · 주택형별 마감재 목록

현장 확인 결과

현장 확인 결과 침실 바닥재가 강화마루로 시공된 것으로 확인됩니다.
감정을 통해 자재 등급 차액 산정이 필요합니다.

확인일: 2026-08-20

입주자모집공고문·분양 카탈로그 원문과 현장 사진·감정 결과를 나란히 대조하는 것은 JL의 차별화 구간입니다. 자료가 없으면 이 슬라이드는 삭제하고 진행합니다. 인용은 원문 그대로만 씁니다.

설계도서가 없으면 대조할 기준이 없습니다 · 정보공개청구로 확보합니다

왜 필요한가

미시공은 도면으로


"있어야 할 것이 없다"를 보이려면 **있어야 한다는** 근거가 필요합니다. 그것이 준공도면입니다.

변경시공은 사양서로

THK 85가 60이 된 것을 보이려면 **형별성능관계내역**이 있어야 합니다.

부실시공은 시방서로

두께·배합 기준은 **공사시방서**에 적혀 있습니다.

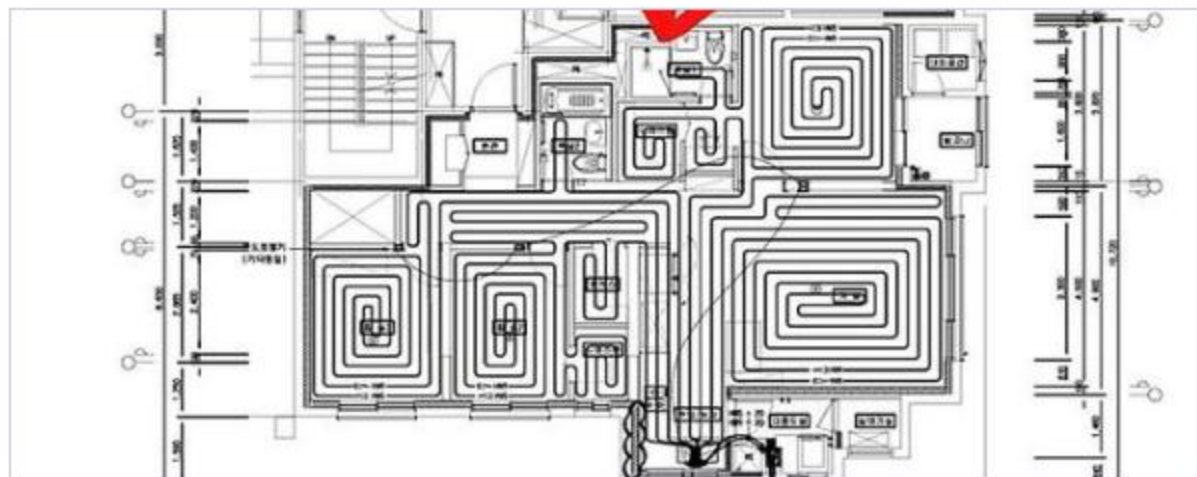

확보하는 설계도서

준공도면 · 공사시방서 · 형별성능관계내역입니다. 없으면 대조할 기준이 없어 무엇이 하자인지 말할 수 없습니다.

정보공개청구로 확보하는 것



세 문서를 나란히 놓고 대조할 때 비로소 하자 여부를 알 수 있습니다

정보공개청구 절차

접수일부터 **10일 이내 결정**이 원칙이고, 비공개 결정 시 이의신청·행정심판을 거칩니다. 착수 직후 바로 청구합니다.

설계도서는 인허가권자 정보공개청구로 확보합니다

확보 대상과 경로

자료	확보 경로
준공도면 · 사용승인도면 · 형별성능관계내역 · 감리보고서	관할 지자체에 정보공개청구
공사시방서 · 준공내역서	정보공개청구 및 문서제출명령
하자보수 요구 공문·회신 · 하자 접수대장	단지 보유 자료 · 관리사무소에서 사본 확보



 핵심 내용 설계도서 확보는 조사보다 먼저 합니다. 기준을 모르는 상태에서 현장을 보면 무엇이 하자인지 판단할 수 없습니다.	 수치 강조 정보공개청구는 접수일부터 10일 이내 결정이 원칙이며, 부득이한 경우 10일 범위에서 연장될 수 있습니다 (정보공개법 제11조).	 기한 경고 비공개 결정이 나면 이의신청·행정심판을 거쳐야 해 시간이 더 걸립니다. 착수 직후 바로 청구를 넣습니다.
--	---	--

PART 4

하자 발굴

DEFECT DISCOVERY

무엇을 찾아내는가

- 01 하자조사 절차 90일
- 02 주요 하자 유형
- 03 유형별 판정 기준과 인정 사례

법무법인 제이엘

JL LAW FIRM

— 하자조사 절차 [고정]

하자조사는 90일 동안 5단계로 진행되며, 단계마다 산출물이 남습니다

1~10일 기본계획 조사 범위·항목·표본 세대 확정 산출 조사계획서	11~25일 사전조사 준공도면·시방서·구조계산서 확보 및 대조 산출 설계도서 대조표	26~45일 상태조사 관할 지자체 정보공개청구로 감리보고서·설계변경 내역 확보 산출 정보공개 회신 자료	46~75일 정밀조사 세대·공용부 현장 실측, 파취조사, 계측 산출 부위별 실측 데이터	76~90일 분석 하자 유형별 정리 및 보수비 산정 산출 하자조사 보고서
---	--	---	--	--

설계도서 대조가 핵심입니다

눈에 보이는 하자보다 **도면에 있는데 시공되지 않은 것**이 금액을 만듭니다. 미시공·변경시공은 도면 대조로만 드러납니다.

정보공개청구를 병행합니다

준공도면·감리보고서는 시공사가 주지 않습니다. 관할 지자체에 정보공개청구해 확보합니다.

감정 신청의 기초가 됩니다

조사 결과가 곧 감정신청 항목이 됩니다. 조사가 부실하면 감정에서 다투지 못합니다.

이 조사가 만드는 것

청구 항목

감정신청서에 올릴 하자 항목 목록

청구 금액

항목별 보수비 산정 근거

입증 자료

도면 대조표·실측 데이터·현장 사진

소요 90일

동의서 징구와 병행 진행

사용검사 전 하자(미시공·변경시공)는 이 단계의 도면 대조에서 발견됩니다. 하해용 변호사 수행 사건 14건에서 **보수비의 66.4%가 사용검사 전 하자**였습니다.

— 주요 하자 유형 [고정]

법무법인 제이엘이 찾아내는 하자는 14종입니다

2026 건설과정식모 (서울중앙지방법원 건설소송심문연구회)의 하자 분류와 하체용 변호사 수행 사례의 하자 내역을 대조해 정리했습니다. 미시공·변경시공은 사용검사 전 원가를 복구해야 하는 규정에

#	하자 유형	부위	성격	기간	#	하자 유형	부위	성격	기간
01	세대 월패드 예비전원장치·홈게이트웨이 미시공	전유부	미시공	3년	08	창호·유리 시공 하자	공용부	미시공·변경시공	3년
02	타일 뒤편 채움 부족 및 부착강도 부족	전유부	변경시공 (부실시공)	2년	09	시멘트 모르타르(미장) 바를 두께 부족시공	공용부	변경시공	2년
03	방수 두께 부족·방수층 축소시공	전유부	미시공 / 변경시공	5년	10	상도 미시공	공용부	미시공·변경시공	2년
04	방화문 성능 미달	공용부	변경시공 (부실시공)	3년	11	경량철골 천장틀 변경시공 및 부속 미시공	공용부	변경시공·미시공	2년
05	세대 대피공간·피난 관련 미시공 및 변경시공	전유부	미시공·변경시공	-	12	콘크리트 균열	공용부	부실시공	5년
06	옥상·옥탑 방수층 축소시공 및 바닥 부속 부족시공	공용부	미시공·변경시공	5년	13	단열재 변경시공 및 이음부 시공불량 (→ 결로·곰팡이)	공용부	변경시공· 부실시공	3년
07	14종을 찾아내는 방법	공용부	미시공	3년	14	부대토목·조경 부족시공	공용부	미시공·변경시공	5년

설계도서 대조

준공도면·시방서·내역서와 실제 시공을 대조합니다. 눈에 보이지 않는 미시공·변경시공은 이 방법으로만 드러납니다.

14종 중 9종에 적용

실측·성능시험

두께·뒤채움률을 실측하고, 방화문은 KS 시험기관에 시료를 보내 성능을 확인합니다.

수치로만 드러나는 하자

정보공개청구

시공사가 주지 않는 준공도면·감리보고서·설계변경 내역을 관할 지자체에 청구해 확보합니다.

대조의 전제 자료

14종

조사 대상 하자 유형

546항목

실제 사건 하자내역서 확인 항목
(공용 463·전유 83)

66.4%

사용검사 전 하자가 차지한 보수비 비중
(하체용 변호사 수행 14건 합산)

5년

미시공·변경시공이 남는 담보책임 구간
2·3년차 도과 후에도 청구 가능

— 하자 유형 분포 [고정]

14종은 기간 구간과 부위로 이렇게 갑니다

기간 구간 · 부위별 분포 — 「2026 건설감정실무」 분류와 JL 하자내역서 대조본

구분 14종	2년 구간 4종	3년 구간 5종	5년 구간 4종
전유부 4종	02 타일 뒤채움·부착강도 부족	01 월패드 예비전원·홈게이트웨이 미시공	03 방수 두께 부족·방수층 축소시공
공용부 10종	09 미장 바름 두께 부족 10 상도 미시공 11 경량철골 천장틀 변경시공	04 방화문 성능 미달 07 소방·전기 부속 미시공 08 창호·유리 시공 하자 13 단열재 변경시공·이음부 불량	06 옥상·옥탑 방수 축소시공 12 콘크리트 균열 14 부대토목·조경 부족시공


구간별 종수 — 3년 구간이 가장 많고, 방수·구조는 5년 구간에 남습니다

2년 · 4종	3년 · 5종	5년 · 4종	별도 1종
---------	---------	---------	-------

항목·부위·기간을 앞장(주요 하자 유형 14종) 표의 값을 그대로 옮긴 것이며, 새로 산정한 값이 없습니다. 기간을 종합건물법 제9조의2 존속기간 구간이고, 05 대피공간은 구간 표기를 확정하지 않아 별도로 두었습니다. 【확인】. 구간은 하자의 성격과 부위에 따라 개별적으로 판단되므로 이 분포는 검토의 출발점이지 결론이 아닙니다.

어떤 하자가 실제로 많이 신청되는지는 공식 통계로 확인됩니다

하심위 하자심사 신청 유형별 비율 ('21~'26.2 평균) · 상위 5종

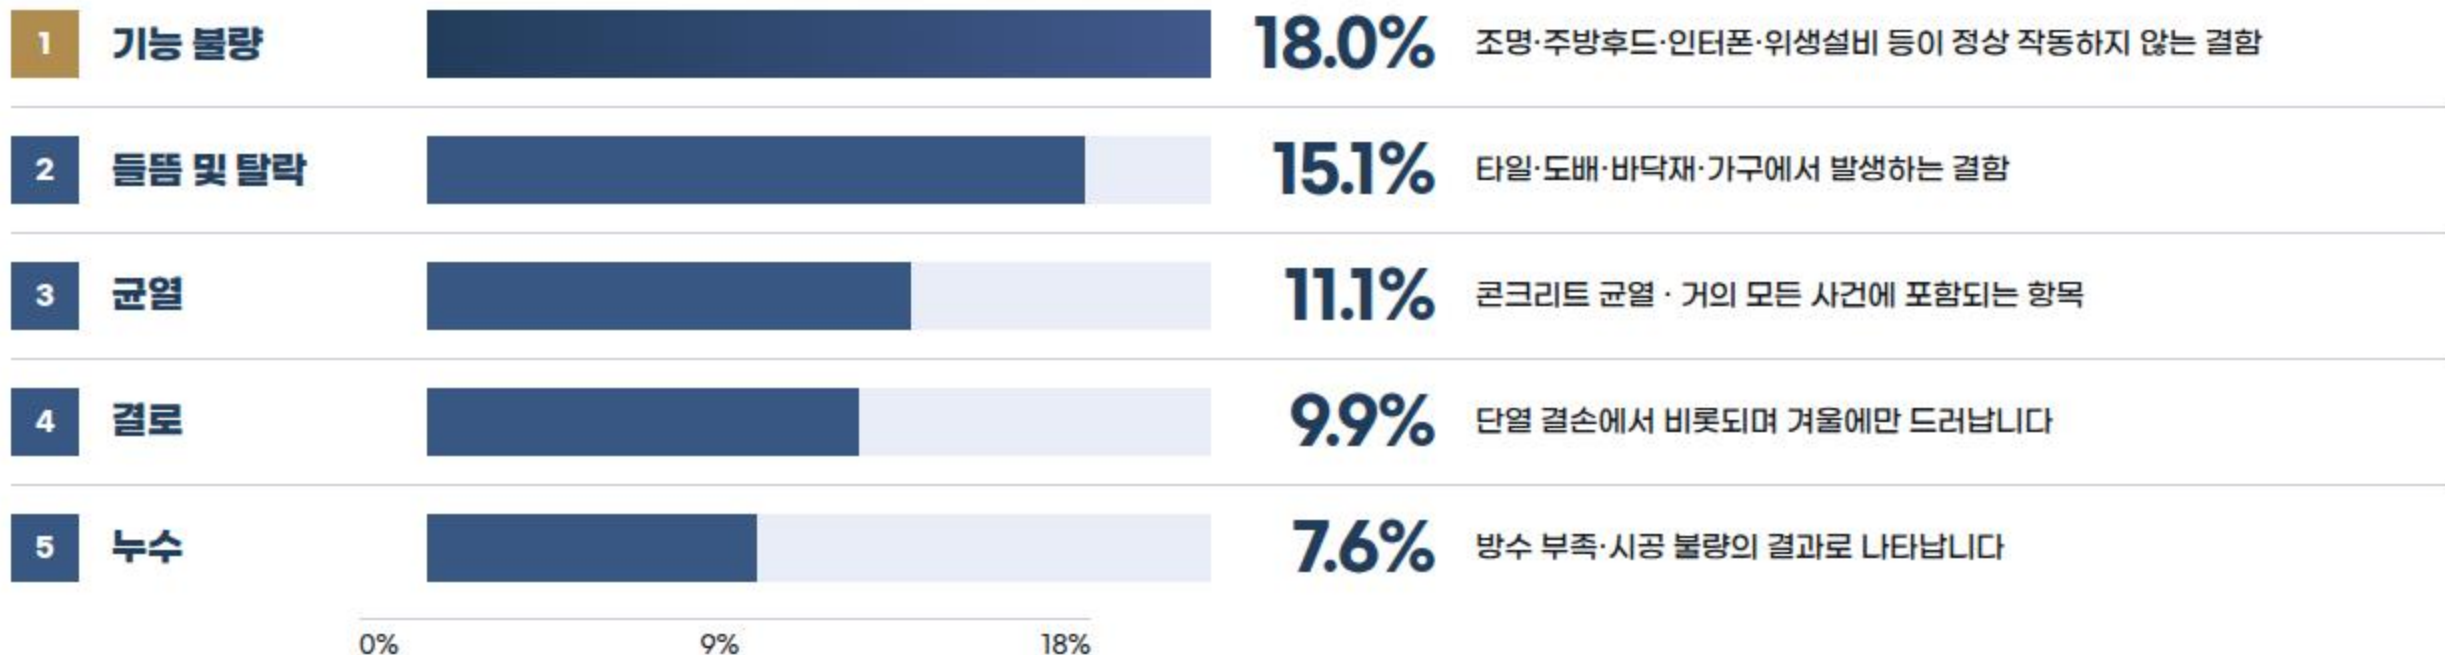

조사 범위를 먼저 정합니다

신청이 많은 유형은 **이스트힐아파트에서도 나타날 가능성이** 높을 것으로 판단되며, 표에 있는 **비율 18.0%**을 기준으로 합니다. (발표 기관·자료명·기준일)는 원문 확인 후 확정합니다 **[확인]**. 신청 건수 비율이며 인정 금액 비율이 아닙니다.

건수와 금액은 다릅니다

위 비율은 **신청 건수** 기준입니다. 인정 금액은 부위 면적과 **공사량**에 따라 달라질 수 있습니다. (발표 기관·자료명·기준일)는 원문 확인 후 확정합니다 **[확인]**. 신청 건수 비율이며 인정 금액 비율이 아닙니다.

결로는 계절을 탐니다

결로 9.9%는 **겨울에만 드러납니다**. 조사 시기를 놓치면 같은 **해상**의 해악이 될 수 있습니다. 출처 표기(발표 기관·자료명·기준일)는 원문 확인 후 확정합니다 **[확인]**.

2.7%는 낮아 보이지만 미시공·변경시공의 단서입니다

나머지 유형·비율은 낮아도 판단이 갈리는 항목입니다

하자 유형	비율	무엇을 말하는가
오염 및 변색·파손	6.8% · 6.4%	마감재 관련
설계도서 상이시공	2.7%	설계와 다르게 시공된 것 · 미시공·변경시공의 단서
부착·접지 불량	1.2%	조명·에어컨·통신설비 배선연결 불량



■ 핵심 내용 신청이 많은 순서와 금액이 큰 순서는 다릅니다. 기능 불량은 건수가 많지만 세대당 금액이 작고, 방수·균열 같은 공용부 항목은 건수가 적어도 금액이 큼니다.	■ 수치 강조 설계도서 상이시공 2.7%는 낮아 보이지만, 이것이 곧 미시공·변경시공이며 5년 구간에 남는 항목입니다. 세대 신고만으로는 드러나지 않아 도면 대조로 찾아냅니다.	■ 기한 경고 세대가 신고하는 하자는 눈에 보이는 것에 몰립니다. 벽 안·바닥 아래의 하자는 신고되지 않은 채 기간이 지나갑니다.
--	---	---

출처: 국토교통부 보도자료 「'26년 상반기 공동주택 하자 판정 상위 20개 건설사 명단 공개」(2026. 3. 29.) 및 같은 자료 참고1·참고2 [1차 출처·공공저작물] · 이 통계는 하심위 하자심사 신청 기준이며 소송에서 인정된 금액 분포와는 다릅니다.

마감이 덮이고 나면 다시 볼 수 없는 것들이 있습니다



바닥 온돌 단열재

세대 바닥에 단열재가 깔린 상태입니다. 이 단계에서만 두께와 규격을 실물로 확인할 수 있고, 몰탈이 덮이면 파취 없이는 볼 수 없습니다.



난방배관 배열

배관 간격과 경로가 그대로 드러난 상태입니다. 설계도면의 배관 간격과 나란히 놓고 대조할 수 있는 유일한 시점입니다.



마감 전 실내

벽체와 바닥이 마감재로 덮이기 직전입니다. 이때 남은 사진 한 장이 뒤에 감정 단계에서 다툼을 줄여 줍니다.

모두 타 단지 조사 사례이며 단지명·동호수·업체명이 드러나지 않도록 확인한 사진만 실었습니다. 이스트힐아파트의 상태를 나타내는 사진이 아니라 조사에서 무엇을 어떻게 확인하는지 보여드리는 예시입니다. 밝기·선명도 보정 외에 합성·확대·생성은 하지 않았습니다.

홈게이트웨이는 "장비가 없다"가 아니라 "당시 기준을 충족했는가"로 다릅니다

두 항목을 나눠서 봅니다 · 성격이 다릅니다

01

예비전원장치 (APU)

설계도서에서 기재된 예비전원장치가 시공되지 않으면 **정전 시 홈네트워크가 정지**합니다. 아래 홈게이트웨이가 논쟁과 **별개 항목**이므로 따로 특정해 청구합니다.



월패드 예비전원장치

단자함을 열어 **설치 여부**를 확인합니다. 사용승인도면 기재와 대조합니다.

02

홈게이트웨이

「지능형 홈네트워크 설비 설치 및 기술기준」(국토교통부 고시)은 홈게이트웨이를 **세대단자함 또는 세대단말기(월패드)에 포함**해 설치할 수 있도록 합니다. 따라서 **월패드 내장형도 적법한 시공 형태**입니다.



홈게이트웨이

"장비가 없다"가 아니라 "**당시 기준을 충족했는가**"로 다릅니다.

홈게이트웨이는 설치·연동·고지 세 단계로 판단합니다

홈게이트웨이는 세 단계로 판단합니다

단계	무엇을 확인하나	판단
① 시점	사업승인일과 그때 시행 중이던 기술기준	이후 개정된 보안 요건은 소급 적용되지 않습니다
② 설계	설계도서에 홈게이트웨이가 별도 장비 로 기재되어 있는가	별도 기재가 있으면 내장형 시공은 변경시공 문제로 넘어갑니다
③ 기능	내장형이라면 그 기능이 실제로 구현 되어 있는가	기능이 없으면 명칭과 무관하게 다룰 여지가 있습니다




핵심 내용 이 항목은 다른 하자와 성격이 다릅니다. 장비가 없다는 사실만으로 하자가 되지 않습니다. 시공사 측은 내장형이면 적법이라고 반박하며, 그 주장은 고지 문언에 근거가 있습니다.	수치 강조 상호연동(KS X 4501)·NAT·시험성적서 보유는 필수 요건이 아니라는 반론 이 제기됩니다. 이 항목만으로 하자를 구성하기는 어렵습니다.	기한 경고 전유부분 설비 하자로 존속기간이 짧습니다. 그리고 사업승인 시점과 당시 시행 고시를 먼저 확보 해야 판단이 시작됩니다.
--	---	---


본 제안서는 시공사 측 반대 논리를 함께 제시합니다. 개별 단지의 판단은 사업승인일과 당시 시행 기준을 확인한 뒤 드립니다. 「지능형 홈네트워크 설비 설치 및 기술기준」 고시 원문은 **확인 대기**입니다.

— 욕실·발코니 타일 뒤편·부착강도 부족 [고정]

타일 탈락면 사진만으로는 부족률이 보이지 않습니다

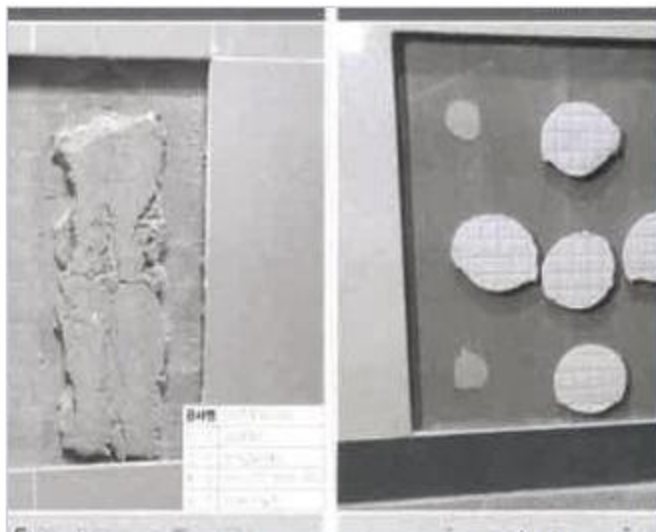

타일 탈락면 · 뒤편 부족 상태 (타 단지 조사 사진)

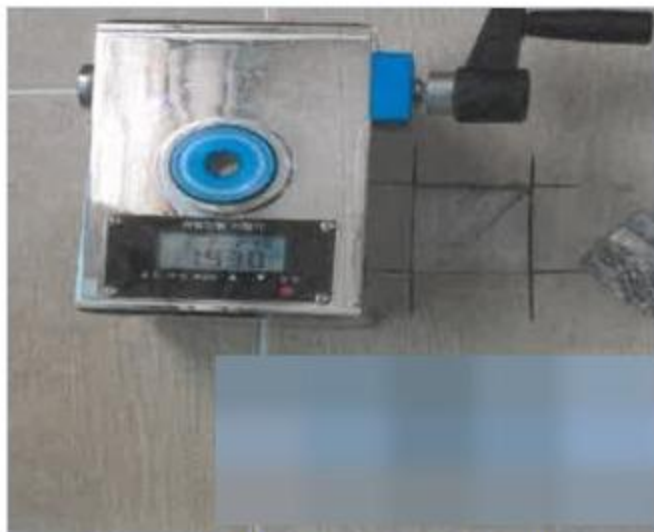

인장 부착강도 시험 · 현장 실측 (단지 표기 마스크)

타일을 탈락시켜 뒤편을 실측하고 부착강도 시험을 병행합니다. 탈락면 사진에 뒤편율(%)과 부착강도 실측값을 함께 제시합니다.

판정 기준

뒤편율	타일 배면에 접착재가 채워진 면적 비율(뒤편율)
부착강도	인장 부착강도 $0.39\text{N}/\text{mm}^2$ 미만이면 하자 · 2026 개정판이 처음으로 제시한 기준입니다
중첩 제외	떠붙이기 타일의 들뜸·파손·탈락 재시공비를 산정할 때 뒤편율 부족 보수비와 중첩되는 면적은 제외합니다

조사 방법

- 1 표본 타일 탈락 후 배면 촬영·뒤편율 실측
- 2 부착강도 시험으로 기준 미달 여부 확인
- 3 지방서상 시공법(떠붙임·압착 등)과 실제 시공 대조

핵심 내용

타일을 탈락시켜 뒤편율을 실측하고 부착강도 시험을 병행합니다. 탈락면 사진만으로는 부족률이 드러나지 않습니다.

수치 강조

부착강도 $0.39\text{N}/\text{mm}^2$ 가 갈림선입니다. 시공 부위·바탕 접착 상태·들뜸 범위를 함께 보아 철거 후 재시공과 접착재 주입 보수 중 어느 쪽인지가 정해집니다.

기한 경고

마감공사 하자는 2년 구간이지만, 미시공·변경시공으로 판단되면 5년 구간에 남습니다. 그 판단 근거를 조사 단계에서 확보합니다.

방수 두께는 원·피고 감정인 공동조사 실측으로 증명합니다



파취 시료 · 캘리퍼로 방수층 두께 실측



계측기 눈금이 보이도록 촬영해 감정서에 첨부

설계도서에 정한 방수 공정(액체방수 1차·2차, 방수모르타르 등) 가운데 일부가 빠지거나 두께가 줄어든 하자입니다. 감정인 공동조사에서 바닥을 파취해 두께를 재고, 설계 기준 두께와의 차액을 보수비로 산정합니다.

판정 기준

하자 성격	미시공 또는 변경시공 · 설계 방수층 공정 일부 누락 또는 두께 축소
기준 두께	설계도서·시방서에 기재된 공정별 두께 · 실측값과 대조
감정 기준	「2026 건설감정실무」 개정판이 방수·미장 하자를 신설·보강 항목으로 명시

조사 방법

- 1 원·피고 감정인 공동조사에서 바닥 파취
- 2 방수층 두께를 계측기로 실측·촬영
- 3 설계도서 기준 두께와 대조해 부족분 산정 · 공정(1차·2차·모르타르) 시공 여부 확인

핵심 내용

방수 하자는 사진으로 보이지 않습니다. 파취 실측값과 설계 두께의 **차액**이 곧 청구액이므로, 계측기 눈금이 보이는 사진을 감정 단계에서 확보합니다.

수치 강조

기준 두께는 단지마다 설계도서가 다르므로 여기서 숫자를 단정하지 않습니다. 감정 실측값과 도면값을 나란히 적어 계산이 가능하게 제시합니다.

기한 경고

방수공사는 **5년** 구간입니다. 미시공·변경시공으로 판단되면 사용검사 전 하자로 남으므로, 그 판단 근거 (공정 누락)를 조사 단계에서 확보합니다.

— 방수 두께 기준의 현실 [고정]

두께 기준은 현장마다 달라 설계도서 확인이 먼저입니다

2026 개정판이 달라진 점

통일 기준 없음	개정판은 두께의 통일 기준을 제시하지 않고, 감정인이 현장 여건에 따라 4mm · 6mm · 벽 6mm/바닥 10mm 등을 기준으로 할 수 있다고 밝혔습니다
그래서	해당 단지 설계도서에 무엇이 적혀 있는지 확인하는 것이 먼저입니다

왜 도해를 함께 쓰나

사진만으로는 기준선과 실측선의 차이가 보이지 않습니다. 단면 모식도에 두 선을 겹쳐 그려야 부족분이 드러납니다.



■ 핵심 내용 원·피고 감정인 공동조사에서 파취 후 방수 두께를 실측하고 설계도서 기준과 대조합니다. 수치가 사진 안에 들어가도록 계측 장면을 촬영합니다.	■ 수치 강조 두께 기준은 현장마다 다릅니다. 개정판이 통일 기준을 두지 않았고, 공사시방서 기재에 따라 두께를 기준으로 삼기 어려운 경우도 있습니다. 설계도서 확보가 이 항목의 출발점입니다.	■ 기한 경고 방수공사는 구조상·안전상 하자로 5년 구간입니다. 누수가 드러난 뒤에는 남은 기간이 길지 않습니다.
---	---	--

— 방화문 성능 미달 [고정]

외관은 멀쩡해도 내화·차연 성능시험에서 미달이 드러납니다



① 시험체 설치



② 가열로 가동



③ 가열면·차연 관찰



④ 비가열면·화염 관통 확인

내화 시험

KS F 2268-1

기준

비차열 1시간 이상 + 차열 30분 이상

차연 성능 시험

KS F 2846

기준

차압 25Pa, 누설량 0.9m³/min·m² 미만

불합격
비율

2026 개정판은 당기는 면과 미는 면의 합격률을 모두 고려해
산정하도록 했습니다

시료 선정부터 성적서 접수까지 감정 절차 전 과정에 입회합니다. 기술적으로
까다로워 다른 법인이 잘 다루지 못하는 항목입니다.

핵심 내용

시료 선정 → 방화문 철거 → 국가공인기관 성능시험 →
시험 결과 → 감정서 반영 순으로 진행하며, 전 과정에
입회합니다.

수치 강조

내화 KS F 2268-1 비차열 1시간 이상, 차연 KS F
2846 차압 25Pa에서 누설량 0.9m³/min·m² 미만
기준입니다.

기한 경고

시료 철거부터 성적서 접수까지 장기간이 소요됩니다.
소송 초기에 시료 선정과 철거를 집행해야 합니다.

균열은 어느 법인이냐 청구합니다. 차이는 원인을 분류해 공법을 관철하는가입니다

원인 분류 · 「2026 건설감정실무」 [표 8] 균열발생 원인과 패턴

A

재료적 성질

7개 원인. 시멘트·골재·배합에서 비롯됩니다.

B

시공

13개 원인. 불충분한 다짐은 수개월 후 불규칙한 표층 균열로, 거푸집 조기 제거는 5~6일 만에 규칙적인 표층 균열로 나타납니다.

C

사용·환경

3개 원인. 사용 중 환경 조건에서 비롯됩니다.

D

구조·외력

4개 원인. 하중·변형에서 비롯됩니다.



타 단지 조사 사례

슬래브에 폐자재가 매립된 채 균열이 동반된 상태입니다. 균열 원인을 재료·시공·구조 중 어디로 볼지 가르는 근거가 됩니다.

균열 원인 분류가 끝나야 보수공법과 재시공비가 정해집니다

원인이 정해지면 보수공법이 정해집니다

① 표면처리 공법 표층에 그친 미세 균열에 적용	② 주입식 공법 균열 내부에 보수재를 주입해 채움	③ 충전식 공법 비교적 큰 폭. 균열을 따라 U형·V형으로 절단한 뒤 충전	④ 도포식 공법 망상균열에 적합
--	---	---	---



핵심 내용 균열 사진은 혼합니다. 다투는 지점은 사진이 아니라 원인 분류 → 공법 결정의 논리를 감정 단계에서 관철하는가입니다.	수치 강조 외벽 층이음 0.3mm 미만 균열은 2026 개정판에서 충전식을 원칙으로 하되, 누수·결로 발생 여부와 수밀·기밀 조치, 부위의 내구성을 고려해 예외적으로 표면처리를 적용할 수 있게 됐습니다.	기한 경고 보수 일위대가도 바뀌었습니다. 노무 공량·단가를 소 제기 시점 기준으로 적용하므로, 제소가 늦어지면 적용 단가 자체가 달라집니다.
---	--	--

근거: 「2026 건설감정실무」(서울중앙지방법원 건설소송실무연구회, 사법발전재단, 2026. 1.) 제3장 3.가 콘크리트 균열 하자 52~56면. [표 8]의 출처는 「실무자를 위한 콘크리트구조물 유지관리매뉴얼」(사단법인 한국콘크리트학회, 2008) 19면입니다.

법원 발간 실무서가 예시로 직접 든 하자입니다 · 설계 18mm, 실측 12mm

원문 예시 · 계단실 벽체 미장 두께 부족

설계 상세도상 치수 18mm	실측 평균 12mm · 6mm 부족	판단 사용검사 전의 변경시공 행위로 발생	산정 하자 없이 시공했을 경우의 시공비용과 하자 있는 상태대로의 시공비용의 차액
---------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---

발생 위치

공용부 계단실 · E/V홀 · AV·PD·EPS·TPS 내부 · 필로티 · PIT · 주민공동시설

전유부 욕실 이중천장 내 조적벽 · 세대 조적벽체

조사 방법 미장면을 국부 절개해 복수 지점에서 바름 두께를 실측한 뒤 평균값을 상세도 치수와 대조합니다

핵심 내용 "두께 부족은 소액이라 다투지 않는다"는 통념을 뒤집는 항목입니다. 법원 실무서가 직접 예시로 든 하자라 감정 신청 항목에서 빠지면 그만큼 청구액이 줄어듭니다.	수치 강조 산정 방식이 원문에 확정되어 있습니다 · 철거· 재시공비가 아니라 시공비 차액 입니다. 이 점을 감정 단계에서 미리 짚어야 합니다.	기한 경고 미장공사는 마감공사로 보면 2년 구간입니다. 사용검사 전 변경시공 임을 조사 단계에서 확정해 두어야 5년 구간을 다룰 수 있습니다.
---	---	---

근거: 「2026 건설감정실무」 42면 [예시] 계단실 벽체 미장(시멘트 모르타르) 두께 부족. 실제 사건 청구 근거로는 건축공사 표준시방서(2013) 15000 미장공사 15015 시멘트 모르타르 바름 3.3
바름두께가 인용됩니다.

단열재는 사용검사 전에 바뀌고, 결로는 사용검사 뒤에 나타납니다

원문 예시 · 설계와 실제의 차이

설계

THK 85mm · 가등급

사용승인도면 형별성능관계내역에 기재된 사양입니다.

실제

THK 60mm · 나등급

두께와 등급이 모두 낮은 자재로 시공되었습니다.

결과

결로 · 곰팡이

시공은 사용검사 이전, 하자 현상은 사용검사일 이후에 나타납니다.



타 단지 조사 사례

단열재가 놓일 자리에 **우레탄폼이 충전**된 상태입니다. 사용승인도면의 형별성능관계내역에 적힌 두께·등급과 대조해 미시공·변경시공에 해당하는지를 판단합니다.

결로 발생 시점을 봐야 하자 여부와 기간 구간이 같습니다

그래서 기간 판단이 같리고, 조사 방법도 정해집니다

원문의 판단 시공은 사용검사 이전이나 결로가 사용검사일 이후 발생했다면 **사용검사 이후 하자**로 봅니다

실무상 의미 보수청구 공문으로 발생 시점을 특정해 두는 절차가 담보책임기간 판단을 좌우합니다

두께·등급 조사 단열재를 국부 절개해 제품 표기를 촬영하고 형별성능관계내역과 대조합니다

결로 부위 조사 발생 부위를 열화상으로 촬영해 단열 결손 위치를 특정합니다



■ 핵심 내용

단열재는 벽 안에 있어 눈으로 확인할 수 없습니다. 절개 조사 없이는 설계와 다른 자재가 들어갔다는 사실 자체가 드러나지 않습니다.

■ 수치 강조

단열공사의 담보책임 구간은 **3년**입니다. 다만 결로가 사용검사 이후 발생한 경우 그 발생 시점을 기준으로 판단합니다.

■ 기한 경고

결로는 겨울에만 드러납니다. 발생한 해에 보수청구 공문을 남겨두지 않으면 발생 시점을 나중에 증명하기 어렵습니다.

근거: 「2026 건설감정실무」 43면 [예시1]. 결로 하자의 판정 기준·보수 범위는 같은 책 제3장 3.4(73면)에 별도로 규정되어 있으나 본문 미확보분이므로 기준 수치는 인용하지 않았습니다.

세대 안만 보면 절반입니다. 금액이 큰 항목은 공용부에 있습니다


부위별로 무엇을 보는가

부위	조사 대상	조사 방법
지하주차장	벽·기둥·천장·바닥 균열, 바닥 마감 두께, 누수	균열 폭·길이 실측, 마감 절개 실측, 누수 흔적 촬영
옥상·옥탑	방수층 두께, 신축줄눈 규격, 파라펫 마감	파취 후 두께 실측, 준공내역서 대조
계단실·E/V홀	미장 바름 두께, 균열, 마감재 사양	국부 절개 실측, 상세도 대조
EPS·TPS·PIT	단열재 두께·등급, 방화 구획, 배관 보온	절개 후 제품 표기 촬영, 형별성능관계내역 대조
외벽	균열, 도장 사양, 창호 주변 코킹	고소 조사 또는 드론 촬영 후 실측
부대토목·조경	포장 두께, 방근시트 유무, 배수	단면 절개, 준공도면 대조

핵심 내용 전유부 하자는 세대별 금액이 작지만 세대 수를 곱하면 커지고, 공용부 하자는 항목 하나가 곧 큰 금액입니다. 두 축을 함께 봐야 청구가 완성됩니다.	수치 강조 지하주차장·옥상·외벽은 철근콘크리트·방수공사로 5년 구간, 내력구조부에 해당하면 10년 구간입니다.	기한 경고 공용부는 관리주체가 이미 부분 보수를 해 버린 경우가 많습니다. 보수 이력과 지출 내역을 먼저 확보해야 합니다.
---	---	---

균열은 충전식 원칙, 타일은 부착강도 $0.39\text{N}/\text{mm}^2$ 기준이 새로 생겼습니다

항목	2016 개정판까지	2026 개정판
콘크리트 균열 층이음 0.3mm 미만	2015년부터 충전식 공법으로 일원화	충전식을 원칙으로 하되, 누수·결로 발생 여부, 수밀성·기밀성 확보를 위한 시공상 조치, 부위의 내구성·품질 상태를 고려해 예외적으로 표면처리 공법 적용 가능
균열 보수 일위대가	2016 개정판의 2014년 단가를 그대로 적용	인력품은 유지하되 노무 공량·노무비 단가는 소 제기 시점 기준, 재료비는 성능이 확인된 제품 중 가장 저렴한 단가를 적용
타일 부착강도	별도 기준 없음	인장 부착강도 $0.39\text{N}/\text{mm}^2$ 미만이면 하자로 판정. 시공 부위·바탕 접착 상태·들뜸 범위를 고려해 철거 후 재시공 또는 접착재 주입 보수를 선택
타일 재시공비	중첩 처리 기준 없음	떠붙이기 공법 타일의 들뜸·파손·탈락 재시공비 산정 시 뒤편 부족 보수비와 중첩되는 면적은 제외

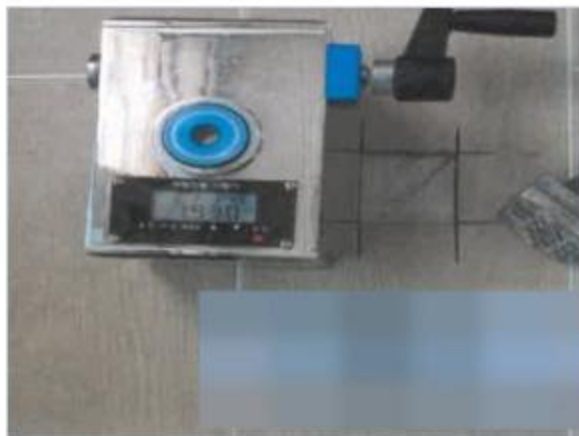

타일 부착강도

개정으로 $0.39\text{N}/\text{mm}^2$ 기준이 새로 생겼습니다. 현장에서 인장 시험기로 측정합니다.

방수 두께는 통일 기준이 없고, 방화문은 성능시험으로 판정합니다

항목	2016 개정판까지	2026 개정판
액체방수 두께	설계도서 상세도·공사시방서 기준	통일 기준을 제시하지 않습니다. 감정인이 현장 여건을 고려해 ① 4mm ② 6mm ③ 벽 6mm / 바닥 10mm 등을 기준으로 삼을 수 있습니다
무니코트 상도	별도 기준 없음	수성싸인펜을 이용한 방식을 원칙적 판단 기준으로. 준공 후 상당 기간 경과 시 샘플을 채취해 외부전문기관 성분분석 시험 의뢰 가능
방화문 성능	별도 기준 없음	당기는 면과 미는 면의 합격률을 모두 고려해 불합격 비율을 산정



방화문 성능

KS 시험기관에 시료를 보내 성능을 확인합니다. 육안으로는 판정할 수 없습니다.

출처:「2026 건설감정실무」(서울중앙지방법원 건설소송실무연구회, 사법발전재단, 2026. 1.) 개정 내용에 관한 법무법인 발간 해설 자료 [2차 출처]. 개별 수치는 원문 확보 후 근거 등급을 올립니다. 판결례는 원문 확인 전이므로 판시 취지를 단정하지 않았습니다.

세대 안에서 확인하는 것은 마감 뒤에 가려진 시공 상태입니다



■ 결로 · 곰팡이

마감 전 벽면에 **점 모양으로 광범위하게** 번졌습니니다. 한 지점이 아니라 벽면 전반에 나타나면 생활 습관이 아니라 **단열·방습층 시공 상태**를 먼저 봅니다.



■ 벽체 접합부 · 폼 충전

두 벽체가 만나는 **접합부** 틈을 **우레탄폼으로 메운** 상태입니다. 단열이 끊기는 지점이므로 결로가 나타난 위치와 겹치는지 대조합니다.



■ 창호 하부 · 바닥 물 고임

마감 전 창호 아래 바닥에 **물이 고인** 상태입니다. 창호 주변 코킹과 물끊기 처리를 따라 유입 경로를 확인합니다.

모두 **타 단지 조사 사례**이며 단지명·동호수·업체명이 드러나지 않도록 확인하고 잘라낸 사진만 실었습니다. 이스트힐아파트의 상태를 나타내는 사진이 아니라 조사에서 무엇을 어떻게 확인하는지 보여드리는 예시입니다. 밝기·선명도 보정 외에 합성·확대·생성은 하지 않았습니다.

금액이 큰 항목은 마감 아래와 흙 속에 묻혀 있습니다



지하주차장 바닥 방수

방수시트 **시공면과 이음부**입니다. 시트 겹침 폭과 실링 상태가 시방서 기준을 충족하는지가 쟁점이 됩니다. 면적이 커서 인정 금액도 큼니다.



되메우기·잡석 혼입 토사

방수보호층 위로 **굵은 돌과 잡석이 섞인 토사**가 그대로 덮이고 있습니다. 다짐이 충분하지 않으면 침하로 이어지므로 굴착 조사로 확인합니다.



지하 구조체·시공 중

지하 구조체의 **철근 배근과 방수 보호층**이 드러난 단계입니다. 흙과 콘크리트로 덮이고 나면 확인할 수 없어, **시공 중 사진이 유일한 근거**가 되기도 합니다.

모두 **타 단지 조사 사례**이며 단지명·동호수·업체명이 드러나지 않도록 확인하고 잘라낸 사진만 실었습니다. 이스트힐아파트의 상태를 나타내는 사진이 아니라 조사에서 무엇을 어떻게 확인하는지 보여드리는 예시입니다. 밝기·선명도 보정 외에 합성·확대·생성은 하지 않았습니다.

배관이 지나간 자리는 그 아래에 흔적을 남깁니다



관통부 우레탄폼 충전

천장 배관 관통부를 우레탄폼으로 메우는 작업입니다. 폼은 채움재이지 방수재가 아니어서 무엇으로 마감했는지가 쟁점이 됩니다.



관통부 아래 벽면

관통부 아래로 넓게 흘러내린 자국이 남았습니다. 자국의 시작점이 관통부와 겹치는지가 원인을 가르는 단서가 됩니다.



바닥 개구부

바닥 개구부가 열린 채 폐자재가 남은 상태입니다. 그대로 덮이면 층간 누수와 소음의 통로가 되므로 조사 항목에 넣습니다.

모두 타 단지 조사 사례이며 단지명·동호수·업체명이 드러나지 않도록 확인한 사진만 실었습니다. 이스트힐아파트의 상태를 나타내는 사진이 아니라 조사에서 무엇을 어떻게 확인하는지 보여드리는 예시입니다. 밝기·선명도 보정 외에 합성·확대·생성은 하지 않았습니다.

PART 5

수행 계획

EXECUTION PLAN

어떻게 진행하는가

- 01 소송 절차 11단계
- 02 채권양도 동의서 징구
- 03 감정 대응 체계
- 04 보고 체계
- 05 전체 일정표

법무법인 제이엘

JL LAW FIRM

— 소송 절차 11단계 [고정]

감정 절차가 소송 전체 소요기간을 좌우합니다



기간을 좌우하는 구간

감정 신청 ~ 감정서 제출

약 11개월. 감정인 지정·현장조사·보고서 작성이 이어지는 가장 구간입니다.

감정 보완

약 4개월. 오류·누락이 있으면 보완을 신청합니다. 단지에 따라 6~10개월까지 늘어납니다.

변론

약 6개월. 감정 결과를 두고 2~3회 공방이 진행됩니다.

판결 이후

판결원리금 수령 약 2개월, 보수공사 착공까지 약 6개월이 더 소요됩니다.

1심 평균 소요기간

약 2년 6개월 종결

소장 접수부터 하자보수 공사까지 11단계로 진행됩니다

1 ~ 5단계 · 감정을 준비하는 과정

1 소장 제출 관할 법원에 소 제기	2 답변서 송달일부터 30일 이내 제출이 원칙	3 감정 신청 하자 항목을 특정해 신청	4 감정인 지정 법원이 후보자 중 지정	5 감정 기일 조사 방법·범위 협의
---	---	---	---	---

6 ~ 11단계 · 감정 결과를 다루고 회수하는 과정

6 현장 감정 원·피고 공동조사·실측	7 감정서 제출 단지 규모에 따라 수개월	8 감정 보완·변론 오류·누락에 보완신청	9 판결 선고 인용 금액·책임제한 확정	10 판결금 수령 집행 또는 임의 이행	11 하자보수 공사 수령액으로 보수 집행
--	--	--	---	---	--

 핵심 내용 감정이 절차의 중심입니다. 앞의 다섯 단계는 감정을 준비하는 과정이고, 뒤의 여섯 단계는 감정 결과를 다루는 과정입니다.	 수치 강조 현장 감정에서 감정서 제출까지가 가장 길어 단지 규모에 따라 수개월이 걸립니다. 이 구간에 움직임이 없어 보여도 진행 중입니다.	 기한 경고 존속기간은 소 제기 시점 으로 판단합니다. 절차가 길다고 미루면 청구할 수 있는 항목 자체가 줄어듭니다.
---	---	---

기간 표기는 일반적인 진행 예시이며 사건별로 달라집니다. 개별 단지의 예상 일정은 착수 후 사건 진행에 따라 별도로 보고드립니다.

동의서 청구는 법인이 직접 수행합니다



현장 접수

입주자대표회의·관리사무소와 협의해 현장 접수 창구를 운영합니다.



문자 접수

구분소유자 대상 문자 안내와 회신을 통해 서명·날인 서류를 받습니다.



주민설명회

동의서의 목적과 절차를 직접 설명해 서명률을 높입니다.

하해용 변호사 수행 사건 채권양도비율 · 판결문 확인 15건

93.28%

15건 단순평균

75.01 ~ 100%

확인된 범위

11건

15건 중 90% 이상

전유면적 기준. 판결문에 양도비율이 기재된 15건만 집계했으며, 개별 사건의 양도비율을 보장하지 않습니다.

양도는 이르게 받을수록 유리합니다

양도받지 못한 면적 비율만큼 청구 규모가 줄어듭니다. 나아가 여러 사건에서 **2·3차로 늦게 양도받은 세대의 2년차·3년차 하자가 제척기간 도과로 소멸**한 사실이 판결문에서 확인됩니다. 늦은 양도는 비율만이 아니라 청구 가능한 공종까지 줄입니다. 그래서 법인이 접수를 직접 맡습니다.

양도서를 몇 세대에서 받느냐가 청구 범위를 그대로 정합니다

진행 순서

1 설명회 세대에 소송 취지와 절차를 설명	2 서식 배포 동의서·채권양도서 세대별 배포	3 징구·검수 회수분의 서명·인적사항 확인	4 양도 통지 취합 명단으로 확정일자부 통지	5 차수 추가 미회수 세대분을 뒤에 붙여 추가 통지
---	--	---	--	--

채권양도 동의서 · 서식

채권양도 동의서

동 호 수

○○○○동 ○○○호

구분소유자

김영 · 성년남성

양 도 내 용

전부부담 하자 손해배상청구

양 수 인

김주지(대표이사)

구분
소유자

채권양도 동의서

양도서를 몇 세대에서 받느냐가 청구 범위를 그대로 정합니다.

받은 동의서는 이렇게 검수합니다

받은 동의서는 이렇게 검수합니다

1 서명 확인

자필 이명인 누락

2 인적사항 대조

동거부상 소유자

3 세대 명단 대조

종목 누락 확인

4 미회수 관리

제2구 대상 정리

받은 뒤가 더 일입니다

서명 확인 · 인적사항 대조 · 미회수 관리가 **전부 수작업**입니다. 사무직원 36명 구성입니다.

실무는 세대 접촉과 서류 보관에서 자주 막힙니다

실무에서 자주 막히는 지점

소유자가 바뀐 세대	채권은 양도 당시의 구분소유자 에게 있습니다. 매매 시점과 하자 발생 시점을 확인해 누구에게 받을지 정합니다
임차 세대	임차인이 아니라 소유자 에게 받아야 합니다. 관리비 고지 명단과 등기부를 대조합니다
회수가 더딘 단지	전 세대를 기다리지 않습니다. 1차 양도분으로 먼저 소를 제기 하고 추가분을 차수로 붙입니다
법인·기관 소유	인감증명·법인등기부가 함께 필요해 시간이 더 걸립니다. 먼저 착수합니다



핵심 내용 임주자대표회의가 자기 이름으로 손해배상을 청구하려면 세대로부터 채권을 양도받아야 합니다. 양도서 정구가 소송의 실질적 출발점입니다.	수치 강조 하혜용 변호사 수행 사건 판결문 15건에서 확인된 양도비율은 평균 93.28% , 중앙값 95.25%, 90% 이상이 11건입니다.	기한 경고 징구에는 수개월이 걸립니다. 존속기간이 임박한 단지는 1차 양도분만으로 먼저 제소 해 기간을 지켜야 합니다.
---	--	---

양도비율은 판결문에 기재된 값을 집계한 것으로, 개별 단지의 회수율을 예측하는 수치가 아닙니다. 회수율은 단지 여건과 설명회 진행에 따라 달라집니다.

— 감정 대응 체계 [고정]

감정 절차 전 과정에 협력 기술진이 함께합니다

1

감정 항목 사전 정리

조사 결과를 바탕으로 감정신청 항목을 구체화

2

협력 기술진 투입

감정인 현장조사에 협력 기술진 임회

3

현장조사 임회

계측 방법·기준 적용을 직접 확인

4

사후 이의

감정보완신청으로 오류·누락 대응

협력 진단업체

(주)좋은도시관리 · 건축 특급기술자 2인이 배치되어 감정인 현장조사에 함께 임회합니다. 법인 내부 건축시공기술사와 같은 자리에서 계측 방법과 기준 적용을 확인합니다.



| 감정 절차 전 과정

감정 항목 정리부터 **현장조사 임회와 사후 이의**까지 협력 기술진이 함께합니다.

| 기한 경고

감정서가 나온 뒤 보완신청 없이 변론이 종결되면 그대로 확정됩니다. 도착 즉시 검토해야 합니다.

— 감정보완신청 사유 [고정]

감정서가 도착하면 이 네 가지를 먼저 봅니다

감정보완신청 사유

항목 누락

신청한 하자 항목이 감정서에서 빠졌거나 판단이 없는 경우

계측 방법 오류

기준과 다른 방법으로 측정했거나 표본 수가 부족한 경우

단가 적용 오류

공법에 맞지 않는 단가나 시점이 다른 단가를 적용한 경우

수량 산출 오류

면적·연장·세대수 산출이 도면·명단과 맞지 않는 경우

감정보완신청의 배대



감정보완신청의 배대

누락 항목 · 기준 오적용 · 수량 오류가 주된 사유입니다. **변론 종결 전**에 내야 합니다.

핵심 내용

2026 개정판은 감정인의 재량을 넓혔습니다. 기준이 하나로 정해지지 않은 항목이 늘었다는 것은, 감정 과정에서 어떤 기준이 적용되는지가 곧 결과가 된다는 뜻입니다.

수치 강조

감정보완신청 사유는 위 네 가지가 대부분입니다. 어느 하나만 관철되어도 인정 금액이 달라집니다.

기한 경고

감정서가 나온 뒤 보완신청 없이 변론이 종결되면 그대로 확정됩니다. 도착 즉시 검토해야 합니다.

— 감정 현장 [고정]

감정 현장은 이 세 단계로 진행됩니다

원·피고 공동조사



원·피고 공동조사

감정인·원고 대리인·피고 측이 **함께 현장에 섭니다**. 이 자리에 들어가느냐가 결과를 좌우합니다.



파취·실측

바닥을 파취해 **방수층과 마감 두께를** 계측합니다. 실제 조사 사례입니다.

현장에서 그 자리에 기록합니다

측정값	위치 표기	사진 대장
여기를 얼마로 했는지	동·층·부위 특정	측정 장면과 비교

세 문서를 나란히 놓고 대조할 때 버로스 하자 여부를 알릴 수 있습니다

그 자리에서 기록합니다

측정값과 위치를 현장에서 남겨야 **감정보완신청의 근거**가 됩니다.

실물 사진은 **타 단지 조사 사례**이며 단지명·동호수·업체명이 드러나지 않도록 확인한 것만 실었습니다. 도해는 절차와 판단 기준을 나타낸 것으로 특정 단지의 상태를 나타내지 않습니다.

— 보고 체계 [고정]

진행 상황은 정기적으로, 정해진 창구로 보고합니다



보고 주기

월 1회 정기 + 주요 시점 수시

정기 보고와 별개로, 절차가 움직이는 시점마다 즉시
별도·별관·나가는 시점



보고 형식

서면 보고 + 요청 시 대면 설명

입주자대표회의가 총회·주민설명회에 그대로 쓸 수 있는
형식으로 정리합니다.



전달 창구

담당 변호사 직통 연락

사건마다 담당 변호사를 지정해 문의가 한 창구로 모이게
합니다.

소장 접수

사건번호·재판부·피고 확정 내역

채권양도 통지

차수별 양도 세대수와 비율

감정 개시

감정인 지정, 감정료 납부, 현장조사
일정

감정서 도착

인정 항목과 금액, 보완신청 여부

판결 선고

인용 금액, 책임제한 비율, 항소 여부
검토

연락은 이 경로로 오갑니다 · 여러 사람에게 나눠서 물어보지 않으셔도 됩니다

당지

입주자대표회의 · 관리사무소

질의·자료 제출·의결 결과 전달



단일 창구

담당 변호사

모든 질의가 여기로 모이고, 여기서 답이
나옵니다



법인 내부

담당 사무직원

채권양도 서류 징구·검수, 세대 명단 관리



협력

협력 기술진

현장조사 입회, 도면 대조, 감정 항목 검토

감정 절차는 진행이 길어 입주자대표회의가 가장 답답해하는 구간입니다. 움직임이 없는 달에도 **현재 어느 단계이고 다음이 언제인지**를 보고합니다.

보고서에는 진행 상황만이 아니라 판단에 필요한 것을 담습니다

정기 보고서 구성 · 월 1회

구분	수록 항목
진행 현황	현재 단계 · 직전 기일 내용 · 다음 기일과 예정 사항
채권양도	차수별 양도 세대수와 비율 · 미회수 세대 현황
감정	감정인 지정 현황 · 감정료 납부 내역 · 현장조사 일정과 결과
쟁점	피고 주장 요지 · 이에 대한 대응 방향 · 판단이 필요한 사항
비용	기간 중 발생한 실비와 집행 내역
요청 사항	임주자대표회의가 준비하거나 결정해 주어야 할 것

보고서에 담는 것

진행 상황
최금 여부, 입회인지

판단 근거
왜 그렇는지, 왜 아닌지

요청 사항
무엇을 결정해야 하는지

이 문서를 나만의 블로그, 대표장 또는 포스트로 제작하여 활용할 수 있습니다

보고서에 담는 것

진행 상황만이 아니라 **판단 근거와 결정할 사항**을 함께 담습니다.

— 수시 보고 시점 [고정]

소장 접수·감정서 도착·판결 선고 시점마다 별도로 보고합니다

별도 보고가 나가는 시점 · 소장 접수 · 감정서 도착 · 판결 선고

수록 내용 사건번호·재판부·피고 확정 내역 / 인정 항목과 금액·보완신청 여부 / 인용 금액·책임제한 비율·항소 검토 의견



수시 보고 세 시점

소장 접수 · 감정서 도착 · 판결 선고 때마다 별도로 보고드립니다.

핵심 내용

임주자대표회의는 총회와 주민설명회에서 설명해야 하는 위치에 있습니다. 그대로 쓸 수 있는 형식으로 정리해 드립니다.

수치 강조

정기 보고는 월 1회, 위 세 시점에는 별도 보고가 나갑니다. 움직임이 없는 달에도 현재 단계와 다음 일정을 알려드립니다.

기한 경고

감정 구간은 길어 답답한 시기입니다. 이 구간에 연락이 끊기는 것이 가장 흔한 불만이라 정기 보고를 고정합니다.

착수부터 보수공사까지 전체 일정입니다

착수

소제기

감정

판결

보수공사

하자조사·동의서 징구

약 3개월

정밀 조사와 채권양도 동의서 징구를 병행합니다.

소장 접수·채권양도 통지

약 2개월

확보된 동의서를 기준으로 소를 제기합니다.

감정·변론

약 18개월

감정 신청부터 변론기일까지 가장 긴 구간입니다.

판결·보수공사

확정 후 순차

판결 확정 후 회수 절차와 보수공사로 이어집니다.

판결은 끝이 아닙니다. 받고, 고치는 일이 남습니다

선고 이후의 갈래

01

임의 이행

피고가 판결금을 지급하면 그대로 종결됩니다.

02

강제집행

지급하지 않으면 **채권압류·추심** 등 집행 절차로 회수합니다.

03

항소

어느 쪽이든 항소할 수 있습니다. 인용 금액과 책임제한 비율을 보고 **실익을 검토**해 의견을 드립니다.

판결은 끝이 아닙니다



판결 선고

선고 이후의 갈래

피고가 지급하면 종결되고, 지급하지 않으면 **강제집행**으로 회수합니다. 어느 쪽이든 항소할 수 있습니다.

지급하지 않으면 집행합니다



채권압류·추심

회수까지가 수행입니다

채권압류·추심 등 집행 절차를 법인이 이어서 진행합니다. 판결로 끝나지 않습니다.

회수금은 보수공사로 이어져야 하자소송의 목적이 완성됩니다

회수 이후 · 보수공사

용도	판결금은 하자보수에 쓰는 것이 원칙입니다. 사용 방법은 관리규약과 총회 의결에 따릅니다
순서	금액이 한정되어 있으므로 안전·누수 관련 항목부터 집행하는 것이 일반적입니다
주의	보수공사를 먼저 해 버리면 나중에 그 항목의 하자 상태를 증명하기 어려워집니다. 감정 전 자체 보수 는 신중해야 합니다



판결 이후가 남습니다

회수금이 **보수공사로 이어져야** 하자소송의 목적이 완성됩니다.

핵심 내용

판결금 수령과 보수공사까지가 실제 목적입니다. 선고 이후 절차도 같은 창구에서 계속 진행합니다.

수치 강조

책임제한이 적용되면 인정 금액 전액이 아니라 그 비율만큼 지급됩니다. 판결문에서 확인된 사례는 **70~85%** 구간입니다.

기한 경고

판결이 확정되어도 상대가 자력이 없으면 회수가 어렵습니다. 소 제기 단계에서 **피고의 자력과 보증기관**을 함께 검토합니다.

책임제한 비율은 하해용 변호사 수행 사건 판결문 7건에서 확인된 범위이며, 개별 사건의 비율은 준공 후 경과 기간·사용 상태 등을 반영해 법원이 정합니다.

PART 6

비용과 조건

COST & TERMS

무엇을 부담하는가

01 보수 조건

02 비용 부담 구조

03 유의사항

법무법인 제이엘

JL LAW FIRM

— 보수 조건 [고정]

착수금과 성공보수는 법인 내부 확정 후 표기합니다

 착수금 [협의] 법인 내부 확정 후 구체 금액을 수록합니다.	 성공보수 [협의] 회수액 기준 비율로 산정하며, 확정 후 구체 비율을 수록합니다.	 패소 시 처리 [협의] 상대방 소송비용 부담 방침·착수금 반환 여부를 확정 후 수록합니다.
시장 관행 참고 · 착수금 무료, 성공보수 약 25% 수준이 일반적입니다. JL의 조건은 이 기준선과 대비해 법인 내부에서 확정합니다.		

확정된 비용 부담 구조 · 착수 단계 비용은 법인이 부담합니다

항목	임주자대표회의	법무법인 제이엘
하자조사·진단 비용	부담 없음	전액 부담
법원 감정료	부담 없음	전액 대납
인지대·송달료	부담 없음	전액 대납
이 슬라이드는 착수금·성공보수·패소 시 처리가 법인 내부에서 확정되는 대로 실제 조건으로 갱신됩니다. 확정 전까지 구체 금액·비율을 추정해 기재하지 않습니다.		

— 비용 부담 구조 [고정]

감정료·인지대·송달료는 법인이 전액 대납합니다



감정료 환산 예시 (시장 단가 세대당 10~40만원 기준)

$$1,000\text{세대} \times 20\text{만원} = 2\text{억원}$$

개별 단지의 실제 감정료는 감정 항목·규모에 따라 달라집니다.

판결 확정 시 소송비용 중 일부는 패소자(시공사 등)로부터 회수될 수 있습니다. 다만 회수 여부와 범위는 법원 판단에 따라 달라지며, 이를 단정적으로 예측하지 않습니다.

핵심 내용

비용 구조를 먼저 밝히는 이유는, 진행 중에 예상하지 못한 지출이 생기면 그때부터 신뢰가 무너지기 때문입니다.

수치 강조

금액이 가장 큰 항목은 **감정료**이며, 단지 세대수와 조사 항목 수에 따라 법원이 정합니다.

기한 경고

감정료를 기한 내 납부하지 않으면 감정 신청이 각하될 수 있습니다. 납부 시점을 미리 안내드립니다.

— 비용 발생 시점 [고정]

비용은 한꺼번에 나가지 않습니다. 절차 단계마다 나누어 발생합니다

단계별 발생 항목

시점	항목	성격
소 제기 시	인지대·송달료	법원 납부금
감정 신청 후	감정료	감정인에게 납부. 단지 규모에 따라 금액이 달라집니다
감정 진행 중	조사 실비	시료 채취·시험 의뢰 등에 드는 비용
보완 감정 시	추가 감정료	보완신청이 받아들여진 경우에 한해 발생
판결 이후	집행 비용	임의 이행되지 않을 때만 발생

절차 단계마다 나누어 발생합니다

절차 단계마다 나누어 발생합니다	
인지대	소 제기 시
송달료	소 제기 시
감정료	감정 개시 시
부담 방식	법원 선지급 후 영수

비용이 나가는 시점

인지대·송달료는 소 제기 시, 감정료는 감정 개시 시입니다. **법인이 선지급합니다.**

— 비용 부담 방식 [고정]

비용은 항목별로 선지급·정산 부담 방식이 다릅니다

부담 방식

법무법인 대납 감정료·인지대·송달료를 **법무법인이 먼저 납부**하고 판결금 수령 시 정산하는 방식으로 진행합니다

협의 사항 착수금·성공보수 비율과 패소 시 처리 방식은 단지 여건에 맞춰 협의해 계약서에 명시합니다

위임계약서에 적히는 것

위임계약서에 적히는 것	
착수금	₩ 1,000,000
성공보수율	₩ 2,000,000
비용 부담	감정료·인지대·송달료 (법무법인 대납)
패소 시 처리	₩ 500,000

위임계약서에 적히는 것

착수금·성공보수율·패소 시 처리는 **확정 전**이며 협의로 정합니다.

핵심 내용

임주자대표회의가 가장 걱정하는 것은 "돈이 언제 얼마나 나가느냐"입니다. 시점을 먼저 보여드립니다.

수치 강조

금액이 가장 큰 것은 **감정료**이며 단지 세대수와 조사 항목 수에 따라 법원이 정합니다.

기한 경고

감정료를 기한 내 납부하지 않으면 **감정 신청이 각하**될 수 있습니다. 납부 시점을 미리 안내드립니다.

— 유의사항 [고정]

감정 결과와 법원 판단에 따라 결과는 달라질 수 있습니다

- 1 청구액은 감정 결과에 따라 변동합니다**
소장 접수 시 청구액은 잠정치입니다(실무상 세대당 200만원 내외로 책정). 감정 결과가 나온 뒤 청구취지변경신청으로 최종 확정합니다.
- 2 소요 기간은 사건마다 다릅니다**
1심 평균 약 2년 6개월입니다. 감정보완신청과 준비서면 공방이 길어지면 더 걸릴 수 있고, 단지에 따라 이 구간만 6~10개월이 소요됩니다.
- 3 감정금액 전액이 인용되지는 않습니다**
법원은 자연노후·사용관리상 과실 등을 이유로 하자보수비의 일정 비율만 인용합니다. 하해용 변호사 수행 사건 중 판결문에서 확인된 책임제한 비율은 **70~85%**(7건)입니다.
- 4 늦게 양도받은 세대는 일부 공종이 소멸할 수 있습니다**
여러 사건에서 2·3차로 늦게 양도받은 세대의 2년차·3년차 하자가 제척기간 도과로 소멸한 사실이 판결문에서 확인됩니다. 동의서 정구가 이룰수록 유리합니다.

그래서 법무법인 제이엘이 하는 것

감정 전 항목 정리

조사 결과로 감정 항목을 구체화해 누락을 줄입니다

현장조사 임회

계측 기준 적용을 직접 확인합니다

감정보완신청

오류·누락이 있으면 보완을 신청합니다

동의서 조기 정구

제척기간 도과로 잃는 공종을 줄입니다

PART 7

마무리

NEXT STEPS

무엇부터 시작하는가

- 01 예상 질의응답
- 02 다음 단계 및 연락처

법무법인 제이엘

JL LAW FIRM

입주자대표회의가 자주 묻는 질문입니다

Q. 비용은 언제, 얼마나 부담하나요?

감정료·인지대·송달료는 법무법인 제이엘이 전액 대납합니다. 착수금과 성공보수는 법인 내부 확정 후 안내합니다.

Q. 소송은 얼마나 걸리나요?

1심 평균 약 2년 6개월이 소요됩니다. 감정보완신청·준비서면 공방 진행에 따라 기간은 달라질 수 있습니다.

Q. 채권양도 동의서를 다 못 받으면 어떻게 되나요?

미양도 세대 비율만큼 청구 규모가 줄어듭니다. 현장·문자 접수와 주민설명회로 동의서 징구를 법인이 직접 지원합니다.

Q. 패소하면 어떻게 되나요?

상대방 소송비용 부담 방침과 착수금 반환 여부는 법인 내부 확정 후 위임계약서에 명시해 안내합니다.

Q. 판결금은 실적 평균만큼 받을 수 있나요?

세대당 평균 329만원은 과거 18건의 실적 참고치이며, 개별 단지의 회수액은 감정 결과와 법원 판단에 따라 달라집니다.

Q. 이미 도과한 하자는 청구할 수 없나요?

공종별로 존속기간이 다릅니다. 도과한 공종은 정직하게 표시하고, 남은 구간(예: 주요구조부·지반공사)에 청구를 집중합니다.

입주자대표회의에서 가장 많이 나오는 질문을 정리했습니다

질문	답변
이미 시공사가 보수해 준 곳도 청구되나요	보수가 제대로 되지 않았거나 재발했다면 청구 대상입니다. 다만 보수 이력과 지출 내역이 있어야 하므로 자료를 먼저 확보합니다.
세대 동의를 다 받아야 시작할 수 있나요	아닙니다. 1차 양도분으로 소를 제기하고 추가분을 차수로 붙일 수 있습니다. 존속기간이 임박했다면 이 방식이 필요합니다.
소송하면 아파트 값이 떨어지지 않나요	하자를 방치해 보수되지 않은 상태가 지속되는 쪽이 자산 가치에 불리하다는 것이 일반적인 판단입니다. 결정은 총회에서 하십니다.
얼마를 받을 수 있나요	감정 결과와 책임제한 비율에 따라 정해지므로 착수 전에 금액을 단정해 말씀드릴 수 없습니다. 수행 실적의 세대당 평균은 규모감을 잡기 위한 참고치입니다.



■ 주민 설명회

법인이 직접 방문해 제안 내용과 채권양도 절차를 설명드립니다.

비용·기간·중도 매도에 관한 질문도 자주 나옵니다

질문	답변
얼마나 걸리나요	감정 구간이 가장 길어 단지 규모에 따라 달라집니다. 1심 진행 흐름은 앞의 절차 11단계에서 설명드린 대로입니다.
기존 관리업체·다른 법인과 이미 상담했는데 문제되나요	상담 자체는 문제되지 않습니다. 다만 이미 체결한 위임계약이 있으면 계약 관계를 먼저 정리해야 합니다.
소송 중에 세대를 매도하면 어떻게 되나요	이미 양도받은 채권은 그대로 유지됩니다. 다만 양도 이전에 매도한 세대는 새 소유자에게서 다시 받아야 합니다.
공사를 먼저 하고 소송하면 안 되나요	권하지 않습니다. 보수해 버리면 하자 상태를 감정으로 증명하기 어려워집니다. 긴급한 안전·누수 항목은 사진과 견적을 남기고 진행하십시오.

핵심 내용 금액과 기간은 단정하지 않습니다. 확정할 수 없는 것을 확정해 말씀드리면 나중에 신뢰가 무너집니다.	수치 강조 세대당 평균 329만원은 하혜용 변호사 수행 18건 (9,979세대)의 실적 평균이며, 개별 단지의 예상액이 아닙니다.	기한 경고 "조금 더 지켜보자"가 가장 많은 답변이지만, 그 사이 2년차·3년차 항목이 도과합니다. 남은 기간부터 계산해 보시길 권합니다.
---	--	---

— 다음 단계 및 연락처 [고정]

이스트힐아파트과 함께 다음 단계를 진행하겠습니다

1	2	3	4
제안 설명회 입주자대표회의·주민 대상 제안 내용 설명	소 제기 의결 입주자대표회의 의결 및 변호사 선임	하자조사 착수 90일 하자조사와 채권양도 동의서 징구 병행	소장 접수 확보된 동의서를 기준으로 소 제기
법인이 직접 방문	안건 초안 지원	비용 법인 부담	인지대·송달료 대납

착수를 위해 준비해 주실 자료

사용검사필증 담보책임 기산일 확정	하자보수보증서 보증기관·금액·기간	하자보수 요청 공문 시공사 회신 포함	입주자모집공고문 분양 카탈로그 포함
하자 접수대장 관리사무소 보유분	입주자대표회의 명부 회장·감사·동대표	구분소유자 명부 동의서 징구용	준공도면 없으면 정보공개청구

법무법인 제이엘 · 주사무소

서울 서초구 서초대로53길 15 정원빌딩 4층 · 02-537-0123

분사무소 · 홈페이지

경기 화성시 동탄 · 1899-4252 · www.jllawfirm.co.kr

— 착수 전 준비 사항 [고정]

선임이 정해지면 단지에서 준비해 주실 것은 다음과 같습니다

① 서류 · 관리사무소 보유분

필수	하자 접수대장 · 하자보수 요구 공문과 회신 · 관리규약 · 입주자대표회의 구성 및 의결 자료
있으면 좋음	기존 하자조사 보고서 · 자체 보수 지출 내역 · 사용검사(사용승인) 관련 서류
저희가 확보	준공도면 · 공사시방서 · 형별성능관계내역 · 감리보고서 · 정보공개청구로 확보합니다

관리사무소가 보유한 자료

하자 접수대장

서대별 접수 처리 기록

보수 요구 공문

시공사 회신 포함

관리규약 · 의결

입대의 구성과 의결 자료

세 문서를 나란히 놓고 대조할 때 비로소 하자 여부를 알릴 수 있습니다.

관리사무소 보유 자료

하자 접수대장 · 보수 요구 공문과 회신 · 관리규약이 그대로 청구의 근거가 됩니다. 보존 연한이 지나면 폐기되므로 착수 시점에 먼저 사본을 확보합니다.

세대에서 받는 서류

세대에서 받는 서류

영 호 수

구분소유자

영 도 내 용

서 명

서명 또는 인

세대에서 받는 서류

전유부분 손해배상은 **세대가 채권자**입니다. 동의서 없이는 그 세대 몫을 청구할 수 없습니다.
